


- 凡例(直轄施工箇所)**
- 令和4年度迄着手済箇所
 - 令和5年度施工予定箇所
 - 計画箇所(防波堤延伸事業)
 - 計画箇所(粘り強い化への改良)
- 整備進捗率(延長ベース)(R4d末時点)**
- 直轄事業: 約81%(延伸)
: 約30%(粘り強い化)

- 凡例(高知県施工箇所)**
- 令和4年度迄着手済箇所
 - 令和5年度施工予定箇所
 - 計画箇所(防波堤延伸事業)
- 整備進捗率(延長ベース)(R4d末時点)**
- 高知県事業: 約32%(延伸)



②防波堤(東第二)
(高知県施工)
本體工
被覆・根固工
(R5.5撮影)

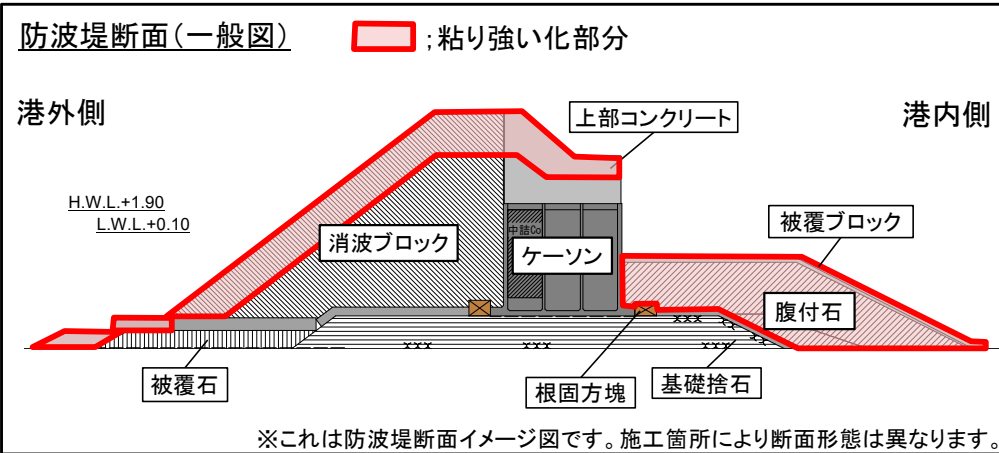

①防波堤(東第一)(直轄施工)
腹付工(R4.8撮影)

③防波堤(南)(直轄施工)
本體工[ケーソン据付](R5.2撮影)

