

# (第2、3ライン) 高知港海岸 整備進捗状況(令和6年度末時点)

潮江地区 棧橋通工区 本体工(R7.3撮影)



浦戸湾地区 横浜工区 本体工(R7.3撮影)



浦戸湾地区 瀬戸工区 本体工(R7.3撮影)



## 凡例(高知県施工箇所)


- : 令和6年度迄着手済箇所
- : 令和7年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)  
高知県事業: 約36%(R6d末時点)

## 凡例(直轄施工箇所)

- : 令和6年度迄着手済箇所
- : 令和7年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)  
直轄事業: 約12%(R6d末時点)

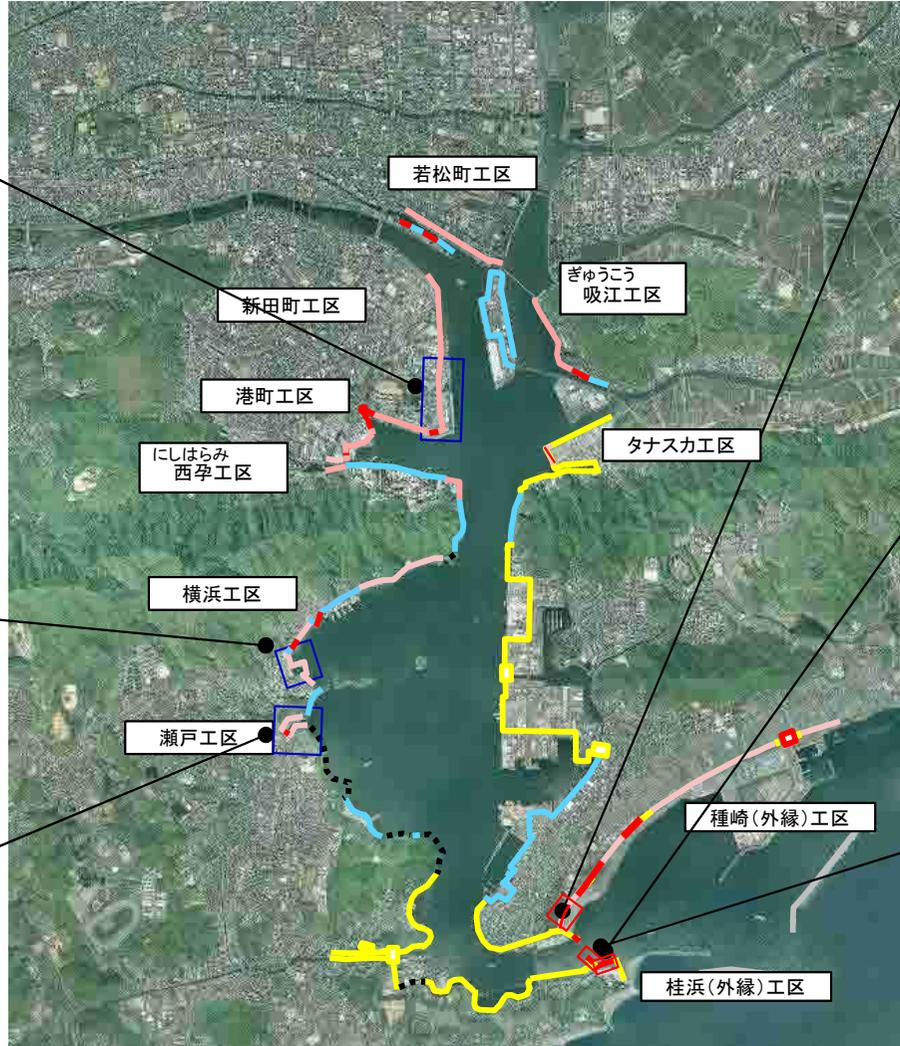

種崎(外縁)工区 千松公園区間 本体工(R7.3撮影)



桂浜(外縁)工区 本体工(R7.3撮影)



津波防波堤(桂浜側) 堤頭部・堤幹部(R7.1撮影)

