

凡例(直轄施工箇所)

- : 令和7年度迄着手済箇所
- : 令和8年度施工予定箇所
- : 計画箇所(粘り強い化への改良)

整備進捗率(延長ベース)(R7d末時点)
直轄事業: 約53%(粘り強い化)

凡例(高知県施工箇所)

- : 令和7年度迄着手済箇所
- : 令和8年度施工予定箇所
- : 計画箇所(防波堤延伸事業)

整備進捗率(延長ベース)(R7d末時点)
高知県事業: 約54%(延伸)

本體工
消波工
被覆・根固工

上部工


腹付工

基礎工
被覆・根固工

上部工
消波工

基礎工
被覆・根固工


上部工
消波工

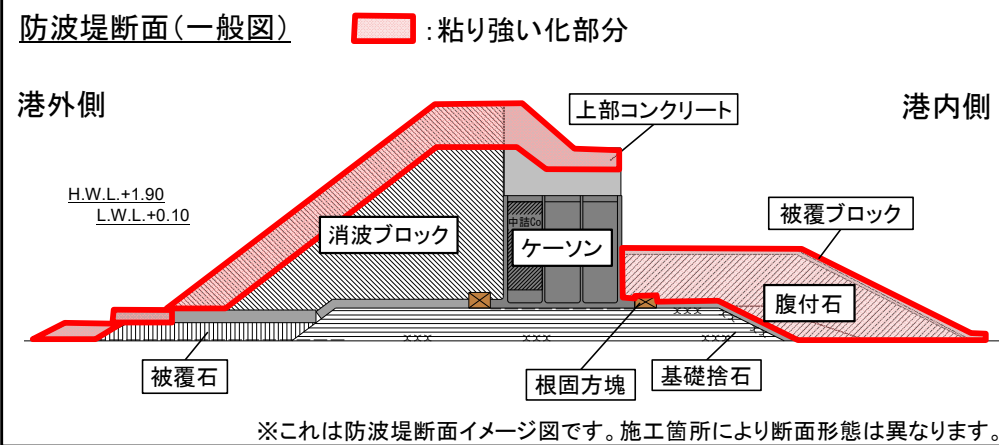

②防波堤(東第二)
(高知県施工)
本體工
被覆・根固工
(R8.1撮影)



①防波堤(東第一)(直轄施工)
腹付工(R7.10撮影)

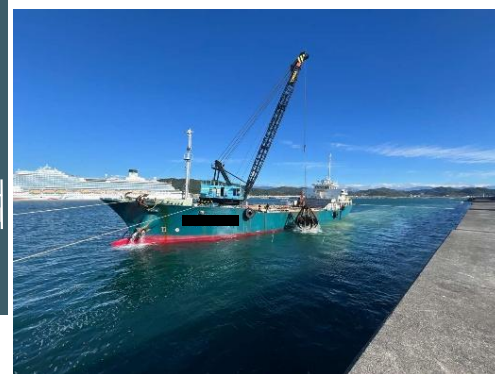

③防波堤(南)(直轄施工)
上部工(R7.7撮影)



※防波堤(南)の延伸は通常時の港内静穏度確保を目的として実施
