

和食ダム 現在の状況

和食ダム堤体コンクリートの打設状況は、令和4年12月中旬時点において打設再開後の予定量22,000m³のうち約3600m³が完了しました（進捗率16%）。今後は、管理設備や電気工事を順次始めていく予定です。

大型車が頻繁に通行しますが、安全に配慮しながら施工を進めていきますのでご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。



○ダム関連工事の施工状況について

・管理棟

ダム天端付近の右岸側上流部では、管理棟を建築するために基礎工事を行っています。基礎の施工の完了は、令和5年3月末を予定しています。

・管理道

左岸側上流部では、ダム天端につながる管理道の施工を行っています。現在、法面の崩壊を防止するために吹付法砕工を実施しています。完了は、令和5年3月に完了する見込みです。

展望台を利用する際には、工事車両の通行等でご不便をおかけしていますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。



和食川河川改修工事のお知らせ

1) 和食川河川改修工事（西地橋上下流部）

令和4年10月～令和5年6月までの期間中、平面図の区間において、和食川河川改修工事を行っています（写真）。

施工順序は、12月中に右岸側の既設護岸の取り壊しを行い、川幅を拡げた後に、①西地橋左岸側から上流に向かって護岸を施工していきます。その後、②西地橋右岸側から上流部の施工、③西地橋右岸側から下流部の順序で工事予定です。

工事期間中は、工事車両の通行や機械の稼働音などで、周辺にお住まいの方には、ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

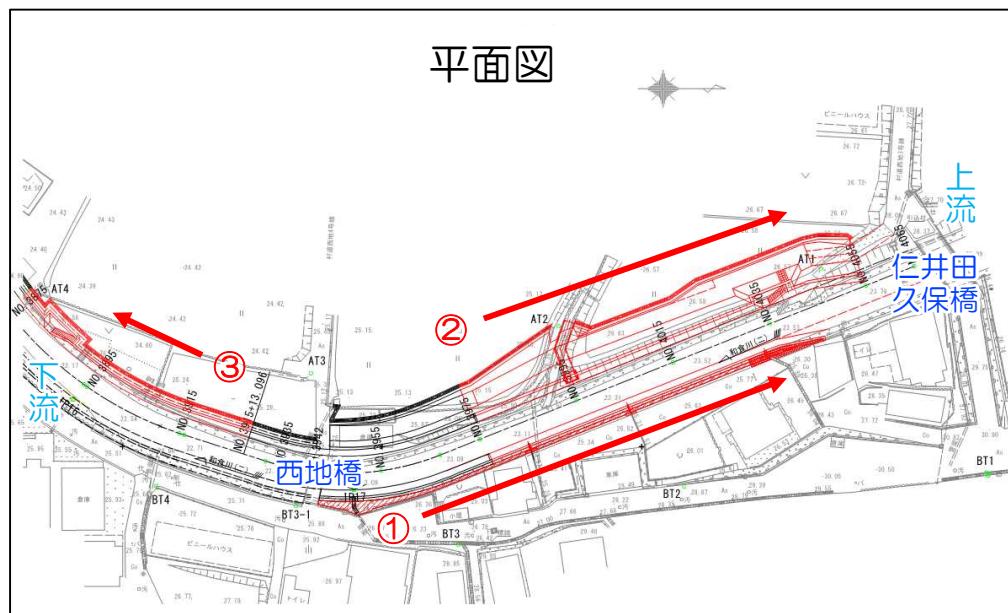


写真 着手前状況（仁井田久保橋から下流を臨む R4.11）

2) 和食川河川改修工事（奥出川合流部付近）

奥出川合流部付近に河川の水が堤防を越えることを防止するために施工している擁壁の工事が完成しました（写真）。工事期間中はご不便をおかけしましたが、ご協力をありがとうございました。

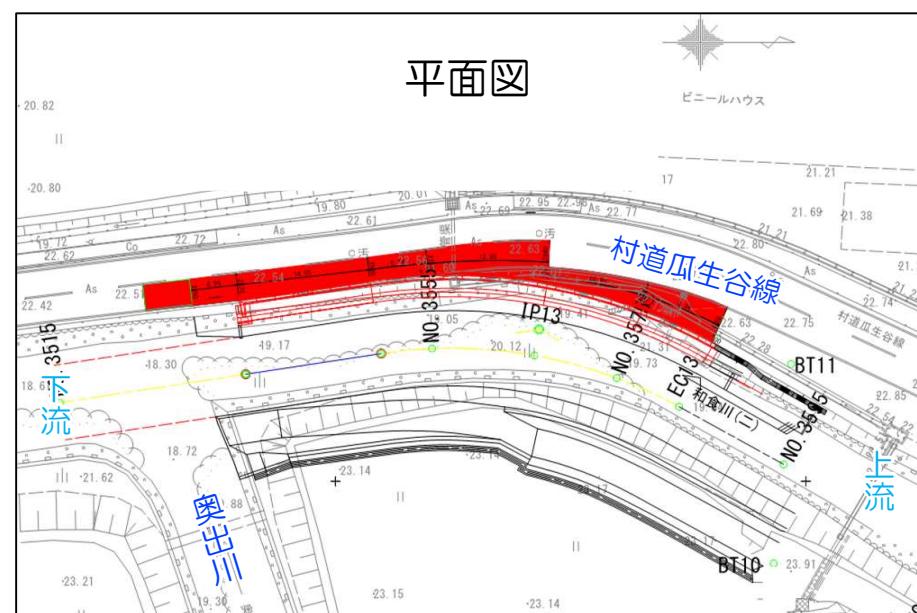


写真 舗装後の村道状況（R4.12）

ダムカード新Verの配布が開始しました

「和食ダムカード」について、平成30年11月から開始した左岸再掘削が令和4年7月に完了したことから、このたびデザインを更新したダムカード（Ver.3.0）を令和4年10月21日から配布開始しました。なお、更新に伴い、これまで配布していたVer2.0を令和4年10月20日をもって配布終了とさせていただきますので、ご了承ください。

詳細は和食ダムHP（下記URL）をご確認ください。

<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/wajikidam/2022102400104.html>

