


第6期南海トラフ地震対策行動計画の進捗状況の概要 (R7年度末見込み)

進捗状況の概要

- ◆第6期行動計画では、「命を守る」、「命をつなぐ」、「生活を立ち上げる」対策の3つのステージで合計463の取組に3か年の年度ごとに目標を設定して推進している。
- ◆令和7年度は、463の取組のうち、半数を超える266(約57%)の進捗率が100%以上(S)を達成し、進捗率90%以上100%未満(A)の取組は79(約17%)になった。一方で、進捗率60%未満(D)の取組が47(約10%)存在する。
- ◆令和8年度は、高知県版の新たな被害想定に基づき、第6期行動計画のバージョンアップを行う。その中で、令和7年度に目標どおり進捗した取組は、今後の目標の前倒しを検討するとともに、進捗が芳しくなかった取組は、課題の解決方法や対策の実施方法を見直すなど、引き続き、今後の目標の達成に向けて取り組む。

目標に対する進捗評価

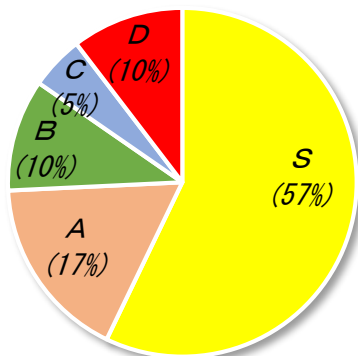

S	57%	(266/463)
A	17%	(79/463)
B	10%	(48/463)
C	5%	(23/463)
D	10%	(47/463)
合計	100%	463



※2月10日時点の
年度末実績見込み

(内訳)

定量目標に対する進捗評価

S: 進捗率100%以上	63%	(230/363)
A: 進捗率90%以上100%未満	12%	(43/363)
B: 進捗率75%以上90%未満	10%	(35/363)
C: 進捗率60%以上75%未満	3%	(11/363)
D: 進捗率60%未満	12%	(44/363)


定性目標に対する進捗評価

よくできた	72%	(72/100)	※S・Aに按分計上
概ねできた	25%	(25/100)	※B・Cに按分計上
できなかった	3%	(3/100)	※Dに計上

対策ごとの進捗状況

※行動計画の主要な取組の進捗状況を資料1-2から抜粋して掲載

命を守る

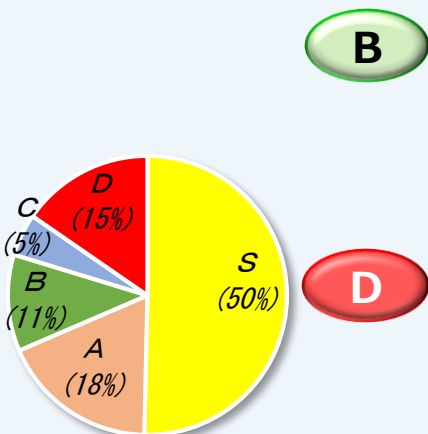

個別避難計画の作成促進 【子ども・福祉政策部】 進捗率 各80%

個別避難計画作成率
 <目標> 優先度が高い人 100% <実績見込み> 80%
 優先度が高い人以外 45% 36%

燃料タンク等の安全対策の推進 【農業振興部】 進捗率 37%(うちL1:15%)

震災対応タンクの整備
 <目標> 200基(うちL1:100基)
 <実績見込み> 73基(うちL1:15基) (累計1,685/8,041基(うちL1:384/1,087基))

沈没船の処分、処理支援 【水産振興部】 進捗率 36%

沈没船の処分
 <目標> 県管理漁港 80隻 <実績見込み> 13隻(累計708/1,009隻)
 市町村管理漁港 60隻 38隻(累計493/816隻)

S

指定避難所の収容能力の拡大 【危機管理部】 **進捗率 137%**

指定避難所の収容能力の拡大
 <目標> +3,000人分 <実績見込み> +4,102人分

県立学校体育館への空調整備 【教育委員会】 **進捗率 100%**

県立学校体育館への空調整備の完了
 <目標> 4校 <実績見込み> 4校(累計13/45校)


B・C

医療機関の水及び燃料の確保 【健康政策部】 **進捗度 概ねできた**

<目標> 全災害拠点病院における3日分以上の水・燃料の確保体制に関するスキーム構築
 <実績見込み> 体制確保が図れていない病院に対して個別訪問を実施し、課題解消に向けた関係機関(地域本部、市町村等)との協議を実施。災害拠点病院に対して詳細調査及びヒアリングを実施。

警察署の高台移転 【警察本部】 **進捗度 概ねできた**

<目標> 香南警察庁舎移転方針等決定
 <実績見込み> 香南警察署庁舎移転の再検討

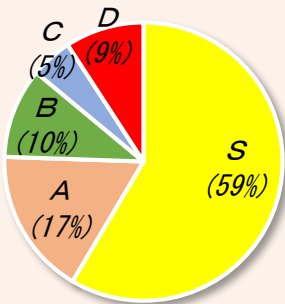

生活を立ち上げる

S

事前復興まちづくり計画の策定 【危機管理部】 **進捗率 100%**

事前復興まちづくり計画の策定
 <目標> 沿岸1市町村 <実績見込み> 沿岸1市(累計3/19市町村)

災害廃棄物仮置場の運用体制の構築 【林業振興・環境部】 **進捗率 100%**

資料作成、書類整理を行う二次仮置場候補地案
 <目標> 全24箇所 <実績見込み> 全24箇所


応急仮設住宅の実効性のある供給体制の確認・維持 【土木部】 **進捗率 100%**

ライフライン及び災害リスクの状況を把握した民有地の割合
 <目標> 100% <実績見込み> 100%

A

上下水道の耐震化の支援 【土木部】 **進捗率 92%**

導水管・送水管の耐震化
 <目標> 51% <実績見込み> 47%

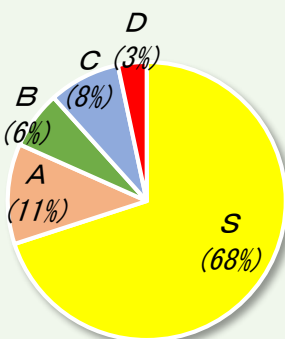

共通課題

S

防災拠点漁港での耐震強化岸壁等の整備 【水産振興部】 **進捗率 100%**

防波堤耐震本体工事
 <目標> L=32.5m <実績見込み> L=32.5m

A

ため池対策の実施(対策工事) 【農業振興部】 **進捗率 90%**

ため池対策工事の完了
 <目標> 10池 <実績見込み> 9池

D

災害時における携帯電話基地局の強靱化対策 【総合企画部】 **進捗率 0%**

本庁舎付近の基地局を始め、強靱化対策を実施
 <目標> 2箇所 <実績見込み> 0箇所

