

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月30日

計画の名称	2. 都市公園における長寿命化対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	高知県, 四万十市, 土佐清水市, 高知市												
計画の目標	都市公園において、公園施設長寿命化計画が未策定の公園について計画策定を行い、その計画に基づいた公園施設の改築・更新を実施することにより、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、適切な維持管理を行っていく。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	485	A	485	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)	(R2末)	(R4末)
1	公園施設長寿命化計画の策定率			
	公園施設長寿命化計画を策定した公園数の割合	0%	100%	100%
	公園施設長寿命化計画を策定した公園数／公園施設長寿命化計画の策定計画のある公園数			
2	公園施設長寿命化計画に基づく更新・改築済み公園施設数の増加			
	改築・更新が必要な公園施設の対策実施率	0%	25%	50%
	改築・更新済公園施設数／改築・更新予定公園施設数			


備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	－	避難行動要支援者名簿の提供	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H30	H31	R02	R03	R04													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高知県	直接	高知県	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	施設の改築・更新 10公園	高知市外7市町	■	■	■	■	■	184	－	策定済
	A12-002	公園	一般	四万十市	直接	四万十市	－	－	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定56公園	四万十市	■					14		－
	A12-003	公園	一般	土佐清水市	直接	土佐清水市	－	－	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定16公園	土佐清水市	■	■	■	■		9		－
	A12-004	公園	一般	土佐清水市	直接	土佐清水市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	施設の改築・更新 16公園	土佐清水市		■	■	■	■	272		策定済
	A12-005	公園	一般	高知市	直接	高知市	－	－	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定30公園	高知市			■			6		－
											小計						485		
										合計						485			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
高知県公園上下水道課内で実施	令和6年8月
	公表の方法
	高知県庁ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	1 公園施設長寿命化計画が未策定の公園について計画の策定を行い、計画的な維持管理、改築・更新を実施することができた。 2 長寿命化計画に基づいた公園施設の改築・更新を実施することにより、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、適切な維持管理を行うことができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心を確保する。	


○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画を策定した公園数の割合		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	改築・更新が必要な公園施設の対策実施率		
	最 終 目標値	50%	改築・更新が必要な公園施設について、目標値以上の対策を実施することができたため。
	最 終 実績値	65%	

参考図面（防災・安全交付金）

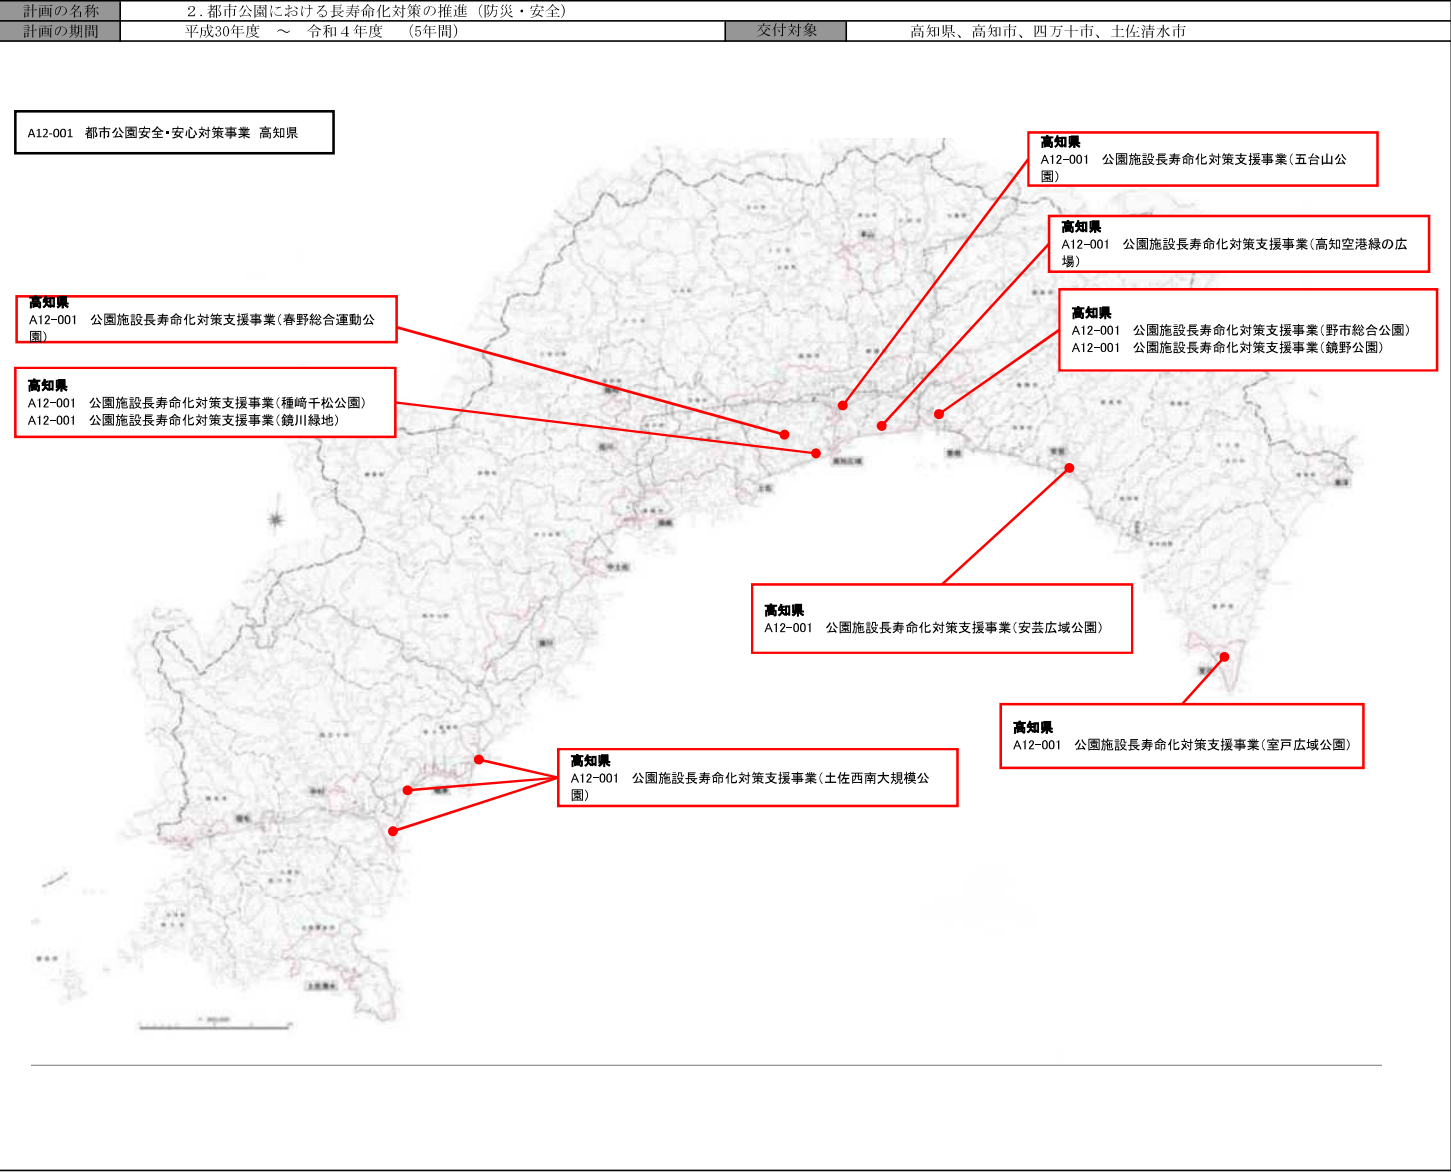

参考図面（防災・安全交付金）

参考図面（防災・安全交付金）

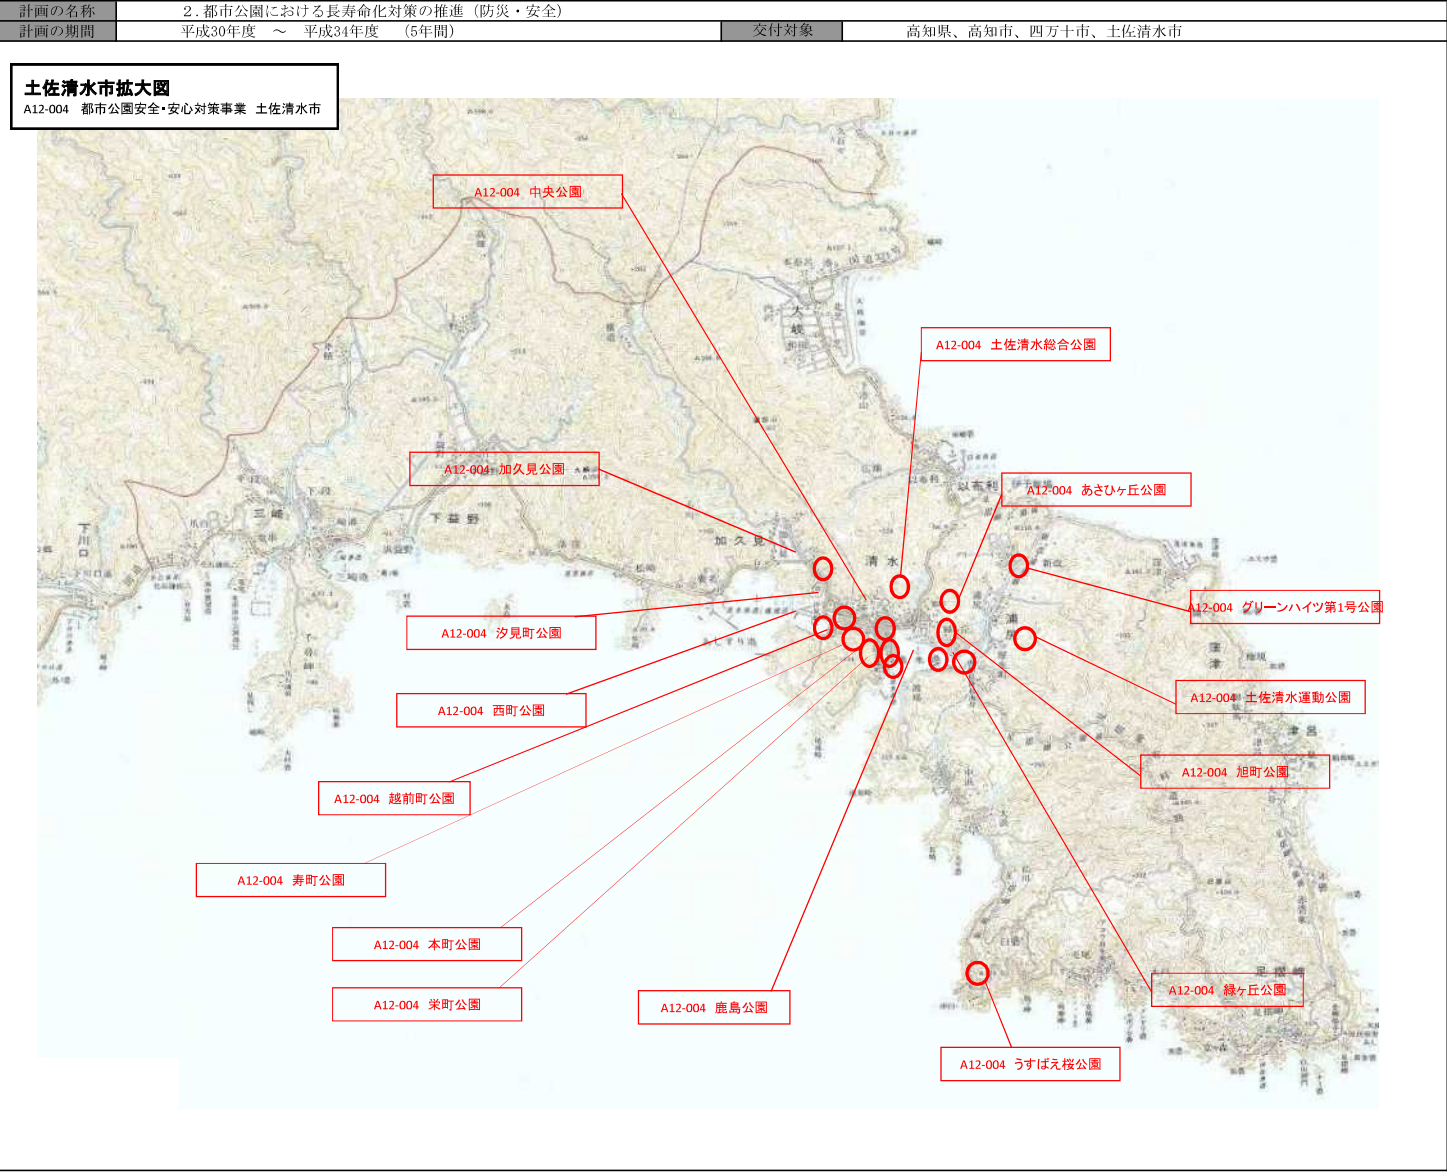

参考図面（防災・安全交付金）

