

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年07月31日

計画の名称	都市公園における公園施設の充実												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	高知県												
計画の目標	公園の新たな施設整備、老朽化した施設の適切な更新を行い、今後開催される大会規模な催しの会場として利用し、インバウンドの拡大とともに、防災機能の強化が図られる。さらに現在の運動施設に求められるニーズに対応するため、老朽化した施設の改修を行い利用者の安全・安心を確保する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	364	A	364	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)
1	計画期間内における改修・整備施設数3施設のうち、H30末には3施設となり、割合は100%となる。 計画期間内における改修・整備が完了した施設数の割合 (改修・整備が完了した施設数)/(改修・整備計画のある施設数)	0%	%	100%
2	大規模地震時における津波被害から公園利用者を守る津波避難施設を整備する。通常時は展望台として利用する。H28当初の避難可能人員は0人で、最終目標は450人となり、H29末には450人となる。 計画期間内における避難可能人数	0人	450人	450人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園等事業(土佐西南大規模公園)	施設改修・整備(3施設)	高知県						364		策定済
												小計					364		
											合計						364		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

令和元年 7月

公表の方法

高知県庁ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況


施設の老朽化対策を行ったことにより、利用者の安全性の向上が図られた。
津波到達時間までに450人が避難可能となった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	新規整備や老朽化対策により改修する公園施設数	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	津波発生時に避難可能となる人数	
	最終目標値	450人
	最終実績値	450人

社会資本総合整備計画 事後評価書（参考図面）

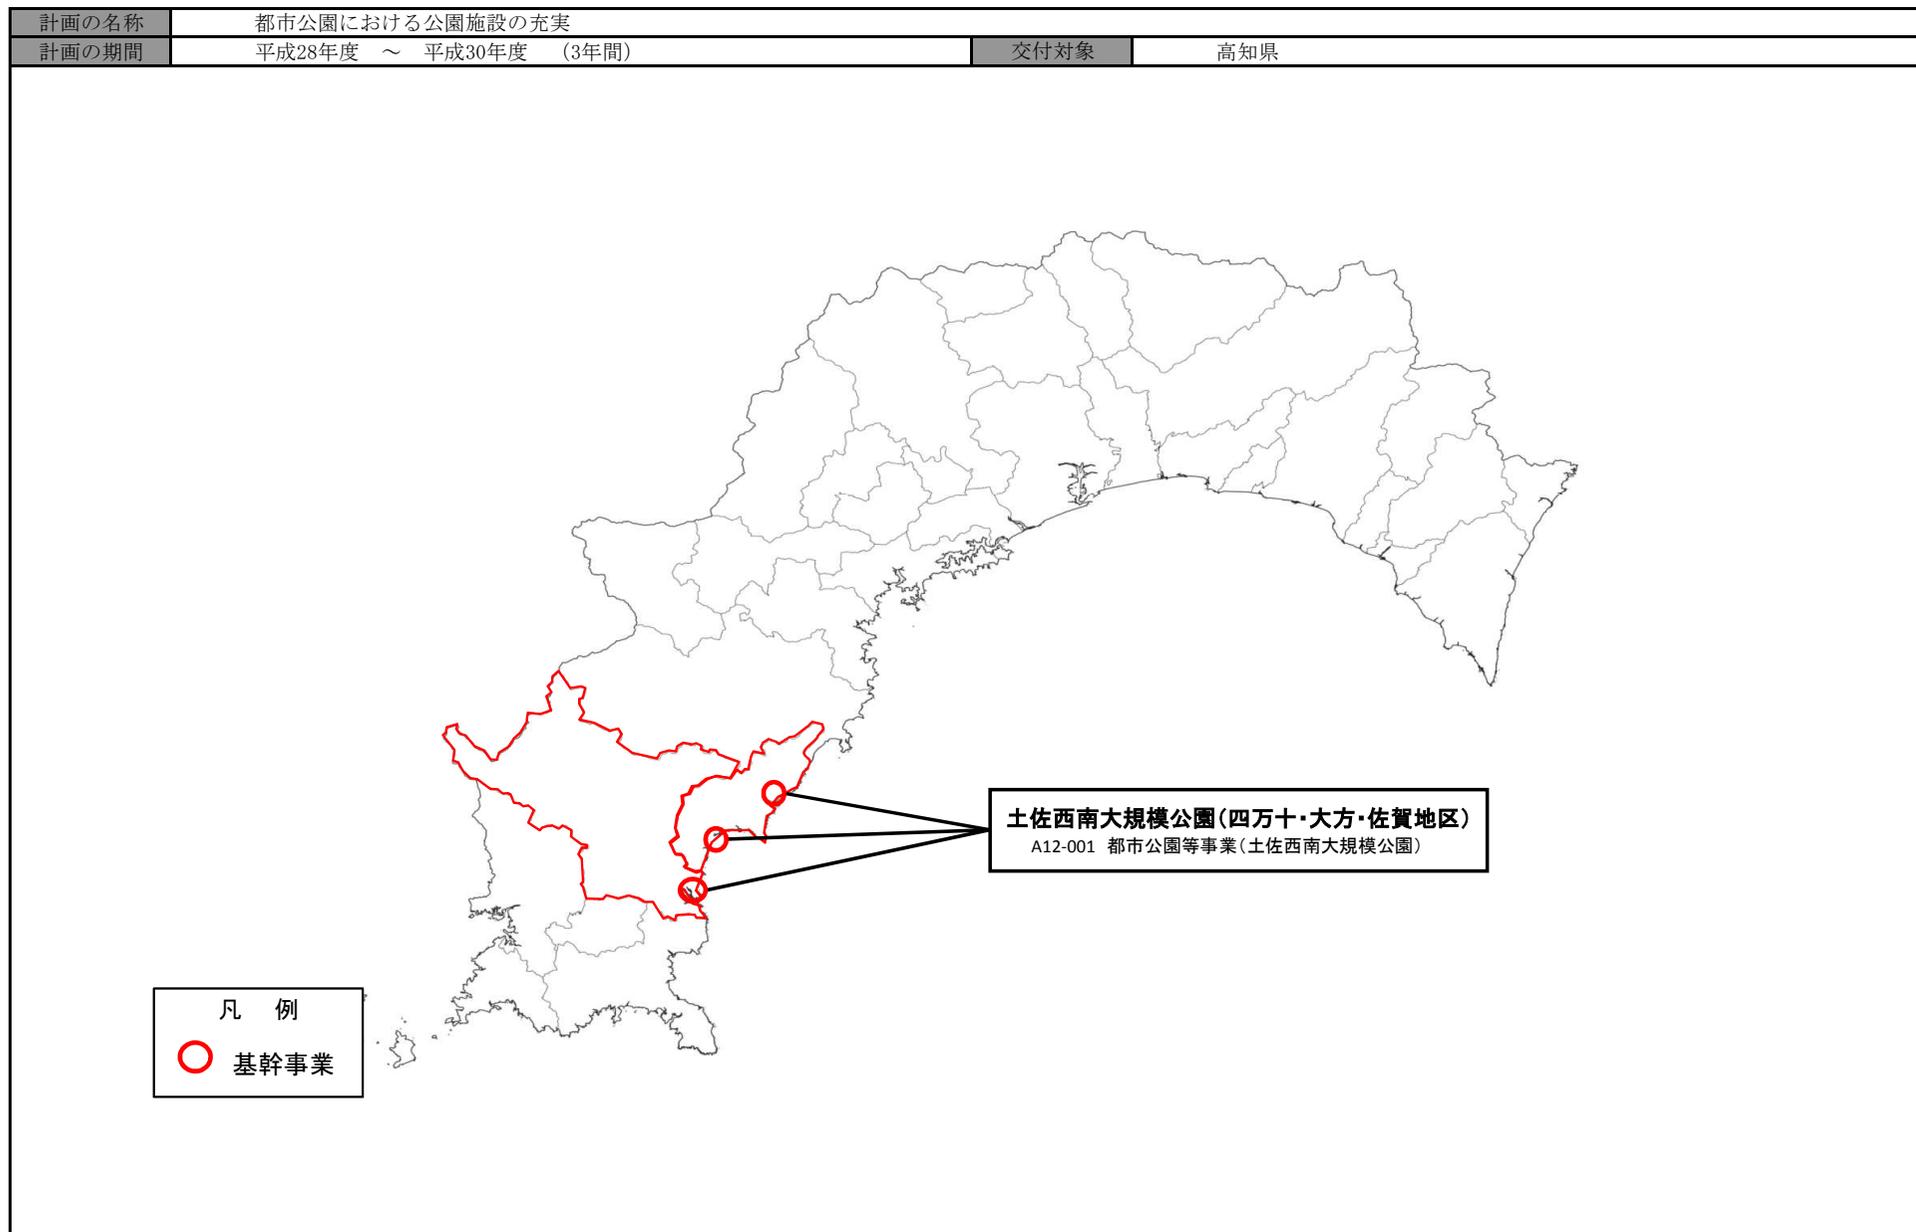

社会資本総合整備計画 事後評価書（参考資料）

計画の名称	都市公園における公園施設の充実		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成30年度（3年間）	交付対象	高知県


◆整備箇所

体育館



テニスコート



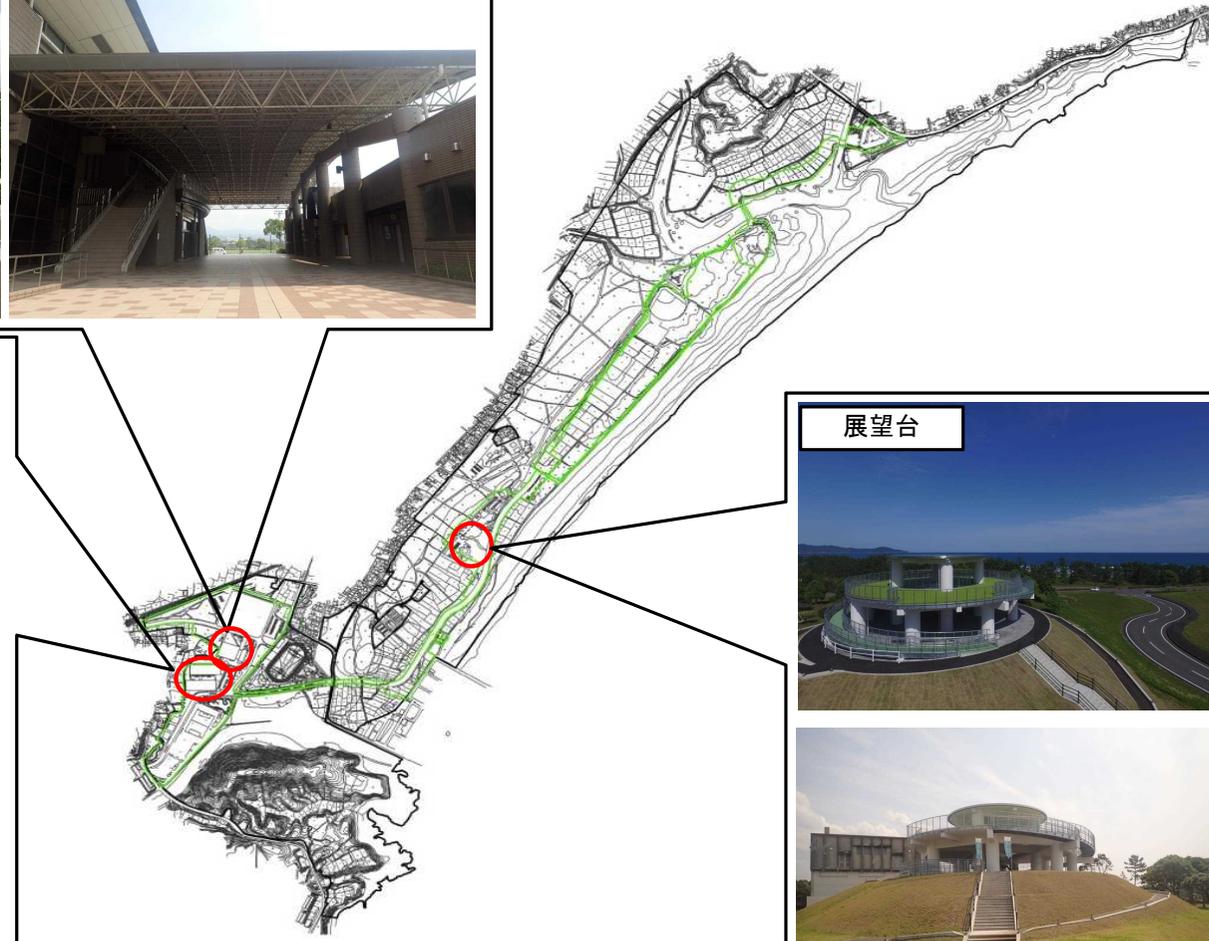

展望台



4
