

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	高知県の公園整備（重点計画）														
計画の期間	令和06年度 ～ 令和06年度（1年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	高知県														
計画の目標	公募設置管理制度（Park-PFI）の活用による、地方公共団体の負担を軽減する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		108	A	108	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R6当初)		(R6末)
1	公募設置管理制度（Park-PFI）活用による地方公共団体の費用負担軽減額（地方公共団体が整備する場合と比較して107百万円軽減）			
	公募設置管理制度（Park-PFI）活用による地方公共団体の費用負担軽減額（地方公共団体が整備する場合と比較して107百万円軽減）	0百万円	百万円	107百万円

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高知県	直接	高知県	－	－	官民連携型賑わい拠点創 出事業（五台山公園）	公園施設整備	高知市	■					108		策定済
											小計						108		
											合計						108		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

高知県公園上下水道課内で実施

事後評価の実施時期

令和8年7月

公表の方法

高知県庁ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

1 公募設置管理制度（Park-PFI）の活用により、特定公園施設の整備を行い、地方公共団体の負担を軽減した。


定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、利用者の利便性向上を図るための施設整備などを進め、さらなる利用促進を図る。
民間活力を活用して、公園の魅力を高め、賑わいの創出と交流の促進を図る。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	107百万円	整備を行う特定公園施設について事業計画の見直しを行ったため
	最 終 実績値	19百万円	

参考図面（社会資本整備総合交付金）

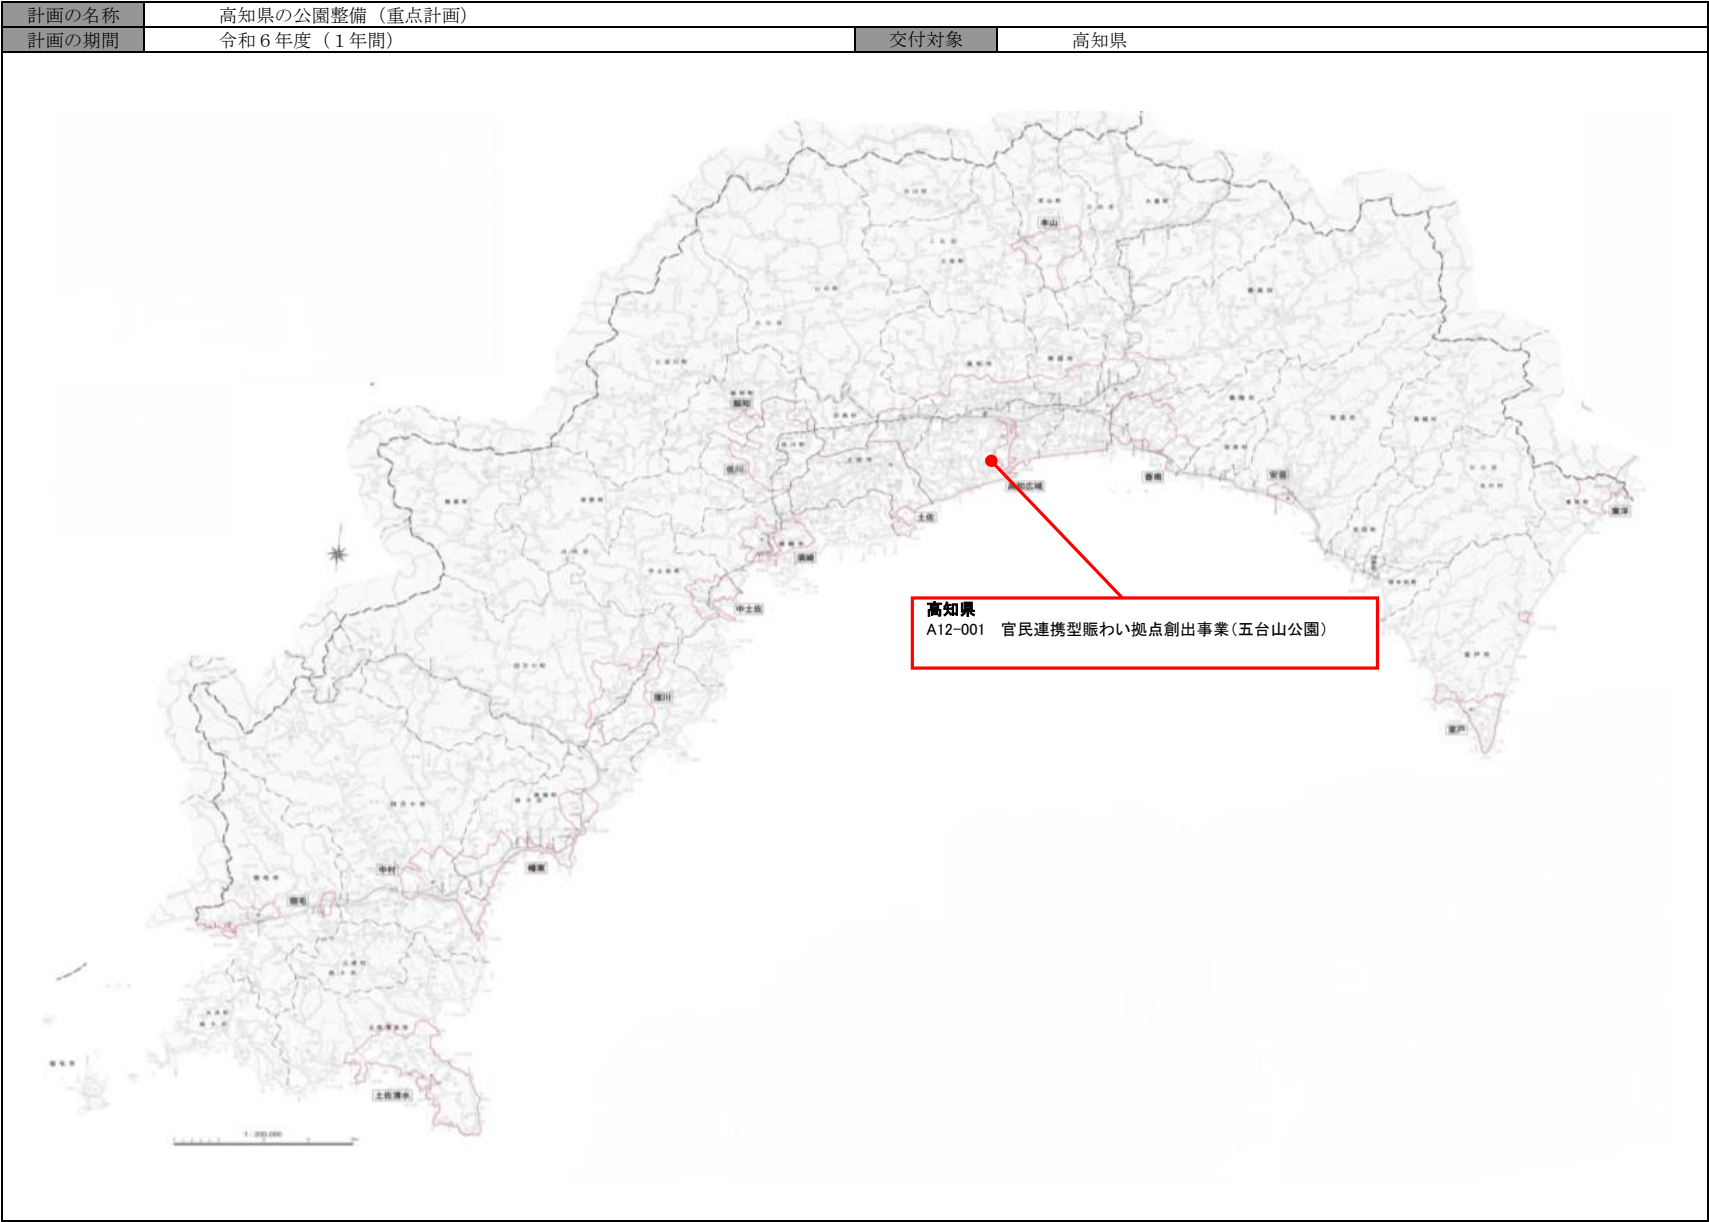

参考図面（社会資本整備総合交付金）

