

社会資本総合整備計画														事後評価書		
計画の名称	高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進（防災・安全）															
計画の期間	令和０２年度 ～ 令和０６年度（５年間）													重点配分対象の該当		
交付対象	高知県,日高村															
計画の目標	高知県は約８割が急峻な山地であり、山から海までの距離が短いため、降雨になれば急流となって一気に海に流れ注ぐ地形的特徴があり、また台風の経路上にあるため全国的にも有数の多雨地帯であり気象条件は非常に厳しい。一方、県都高知市などが位置する下流平野部は地盤標高が極めて低く、河川勾配も緩やかな地形のため度々浸水被害を被っており、また近い将来に発生が予測されている南海トラフ地震では堤防沈下による津波浸水被害が懸念される。このため各河川流域が一体となって浸水対策を実施し、水害に強い都市づくりを行うとともに、環境を保全するため、豊かな自然、水利用に配慮した川づくりを進める。															
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		27,042	A	25,844	B	0	C	1,198	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		4.43	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和２年度当初	令和４年度末	令和６年度末
1	近年災害または慢性的な浸水など浸水被害の大きい流域における浸水の恐れがある戸数の軽減（691戸）			
	浸水の恐れがある戸数の減少数（戸） （浸水が解消される区域にある浸水の恐れがある全体戸数）×（計画期間の事業費）／（浸水が解消される区域の全体事業費）	0戸	407戸	691戸
2	地震で発生する液状化等による沈下で、長期浸水の恐れがある区域の軽減（300ha）			
	長期浸水の恐れがある区域の軽減面積（ha） （対策により長期浸水が軽減される区域の全体面積）×（計画期間の整備延長）／（長期浸水が軽減される区域の全体整備延長）	0ha	150ha	300ha
3	排水機場・水門等の河川管理施設の耐震対策の実施（3施設）			
	排水機場・水門等の河川管理施設の耐震対策の実施数：3施設	0施設	1施設	3施設
4	大規模な排水機場・水門等の延命化対策の実施（1施設）			
	大規模な排水機場・水門等の延命化対策の実施数：1施設	0施設	1施設	1施設
5	水防活動および水文資料収集のために必要な情報収集施設（水位計、河川監視カメラ）の設置（56箇所）			
	水位計設置数：27箇所 河川監視カメラ設置数：29箇所	0箇所	28箇所	56箇所

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
高知県強靱化計画に基づき実施される要素事業：A1～A2の全て												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-001	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 1 ）	-	A1-1-1宇治川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁架替 等（L=0.1km）	いの町	■	■	■	■	■	350		-
	A03-002	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 1 ）	-	A1-1-2波介川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削等（L=1.2k m）	土佐市	■	■	■	■	■	1,281		-
	A03-003	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 1 ）	-	A1-1-3柳瀬川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁架替 等（L=0.5km）	越知町・佐川町	■	■	■	■	■	411		-
	A03-004	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 1 ）	-	A1-1-4仁井田川広域河川 改修事業	築堤、護岸、掘削等（L=0.4k m）	四万十町	■	■	■	■	■	521		-
	A03-005	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 1 ）	-	A1-1-5中筋川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削等（L=0.1k m）	宿毛市	■	■	■	■	■	394		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-006	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 2 ）	-	A1-1-6烏川広域河川改修 事業	築堤、護岸、掘削等（L=0.4k m）	香南市	■	■	■	■	■	206		-
	A03-007	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 2 ）	-	A1-1-7志奈祢川広域河川 改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁架替 等（L=1.0km）	高知市	■	■	■	■	■	1,750		-
	A03-008	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 2 ）	-	A1-1-8奈半利川広域河川 改修事業	築堤、護岸、掘削等（L=1.5k m）	奈半利町・田野 町	■	■	■	■	■	482		-
	A03-009	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 2 ）	-	A1-1-9新川川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁架替 等（L=0.5km）	高知市	■	■	■	■	■	714		-
	A03-010	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 2 ）	-	A1-1-10松田川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削等（L=0.1k m）	宿毛市	■	■	■	■	■	150		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-011	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 2 ）	-	A1-1-11下井川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁架替 等（L=1.1km）	香南市	■	■	■	■	■	1,750	3	-
	A03-012	河川	一般	高知県	直接	高知県	広域河 川（ 2 ）	-	A1-1-12久万川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削等（L=0.5k m）	高知市	■	■	■	■	■	500		-
	A03-013	河川	一般	高知県	直接	高知県	流対河 川（ 1 ）	-	A1-2-1日下川流域治水対 策河川改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁架替 等（L=0.7km）	日高村	■	■	■	■	■	1,800		-
	A03-014	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（ 2 ）	-	A1-3-1高知地区地震・高 潮対策河川事業（松田川 ）	堤防地震対策（L=1.5km）	宿毛市	■	■	■	■	■	837		-
	A03-015	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（ 1 ）	-	A1-3-2高知地区地震・高 潮対策河川事業（後川）	水門地震対策2基	南国市	■	■	■	■	■	1,250		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-016	河川	一般	高知県	直接	高知県	地震高 潮（ 2 ）	-	A1-3-3高知地区地震・高 潮対策河川事業（浜改田 川）	水門地震対策1基	南国市	■	■	■	■	■	350		-
	A03-017	河川	一般	高知県	直接	高知県	特構（ 2）	-	A1-4-1十市川特定構造物 改築事業（十市川排水機 場）	延命化措置	南国市	■	■	■	■	■	264		策定済
										小計						13,010			
その他総合的な治水 事業	A08-018	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	広域系	-	A1-5-1高知東部圏域総合 流域防災事業（安田川他 ）	築堤、護岸、掘削、橋梁、情 報基盤整備、樹木伐採等	安田町他	■	■	■	■	■	4,350		-
	A08-019	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	広域系	-	A1-5-2高知中部圏域総合 流域防災事業（奥田川他 ）	築堤、護岸、掘削、橋梁、情 報基盤整備、樹木伐採等	いの町他	■	■	■	■	■	2,290		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水 事業	A08-020	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	広域系	-	A1-5-3高知西部圏域総合 流域防災事業（久礼川他 ）	築堤、護岸、掘削、橋梁、情 報基盤整備、樹木伐採等	中土佐町他	■	■	■	■	■	4,238		-	
	A08-021	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	広域系	-	A1-5-4吉野川上流圏域総 合流域防災事業（地蔵寺 川他）	築堤、護岸、掘削、橋梁、情 報基盤整備等	土佐町他	■	■	■	■	■	1,806		-	
	A08-022	総合治水	一般	日高村	直接	日高村	氾濫減 災	-	A1-5-5高知中部圏域総合 流域防災事業（日下川）	嵩上工（4戸）、周囲堤擁壁 工（L=273m）	日高村	■	■	■	■	■	150	2	-	
												小計						12,834		
											合計						25,844			

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水 事業	C08-001	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	情報・ 河川	-	C1-1-1高知東部圏域総合 流域防災事業（安田川他 ）	浸水想定区域図作成	安田町他	■	■	■	■	■	314		-	
		円滑かつ迅速な避難行動に寄与																		
	C08-002	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	情報・ 河川	-	C1-1-2高知中部圏域総合 流域防災事業（奥田川他 ）	浸水想定区域図作成	いの町他	■	■	■	■	■	286		-	
		円滑かつ迅速な避難行動に寄与																		
	C08-003	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	情報・ 河川	-	C1-1-3高知西部圏域総合 流域防災事業（久礼川他 ）	浸水想定区域図作成	中土佐町他	■	■	■	■	■	508		-	
		円滑かつ迅速な避難行動に寄与																		
	C08-004	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	情報・ 河川	-	C1-1-4吉野川上流圏域総 合流域防災事業（地蔵寺 川他）	浸水想定区域図作成	土佐町他	■	■	■	■	■	90		-	
		円滑かつ迅速な避難行動に寄与																		
												小計						1,198		
										合計							1,198			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

高知県土木部にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

事後評価：令和8年7月

公表の方法

高知県土木部土木政策課のHPで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・各河川ごとの事業進捗に伴う浸水家屋の減少
- ・高知市外における長期浸水対策による浸水面積の減少

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

- ・河川整備計画区間の整備延長の増
- ・各河川ごとの事業進捗に伴う浸水面積の減少
- ・想定最大規模降雨の浸水想定区域図の作成


○特記事項（今後の方針等）

指標、に關する事業については、令和7年度～令和11年度を計画期間とする「高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進（防災・安全）」により、事業を継続実施していく

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水の恐れがある戸数の減少数		
	最 終 目標値	691戸	当初計画にあった地蔵寺川、日下川、志奈弥川を他事業に移行したことに伴う実績値の減少
	最 終 実績値	329戸	
2	津波による浸水の恐れがある区域の解消面積		
	最 終 目標値	300ha	市管理施設である排水機場隣接箇所への調整に時間を要したことによる進捗の遅れ
	最 終 実績値	17ha	
3	河川管理施設の耐震対策の実施数		
	最 終 目標値	3施設	函渠部から耐震対策を実施したことによる事業進捗の遅延
	最 終 実績値	0施設	
4	河川管理施設の長寿命化対策		
	最 終 目標値	1施設	交付金事業から補助事業に移行したことに伴う実績値の減少
	最 終 実績値	0施設	
5	水位計及び河川カメラ設置数		
	最 終 目標値	56箇所	
	最 終 実績値	56箇所	

(参考図面)

計画の名称	1 高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)	交付対象	高知県、日高村

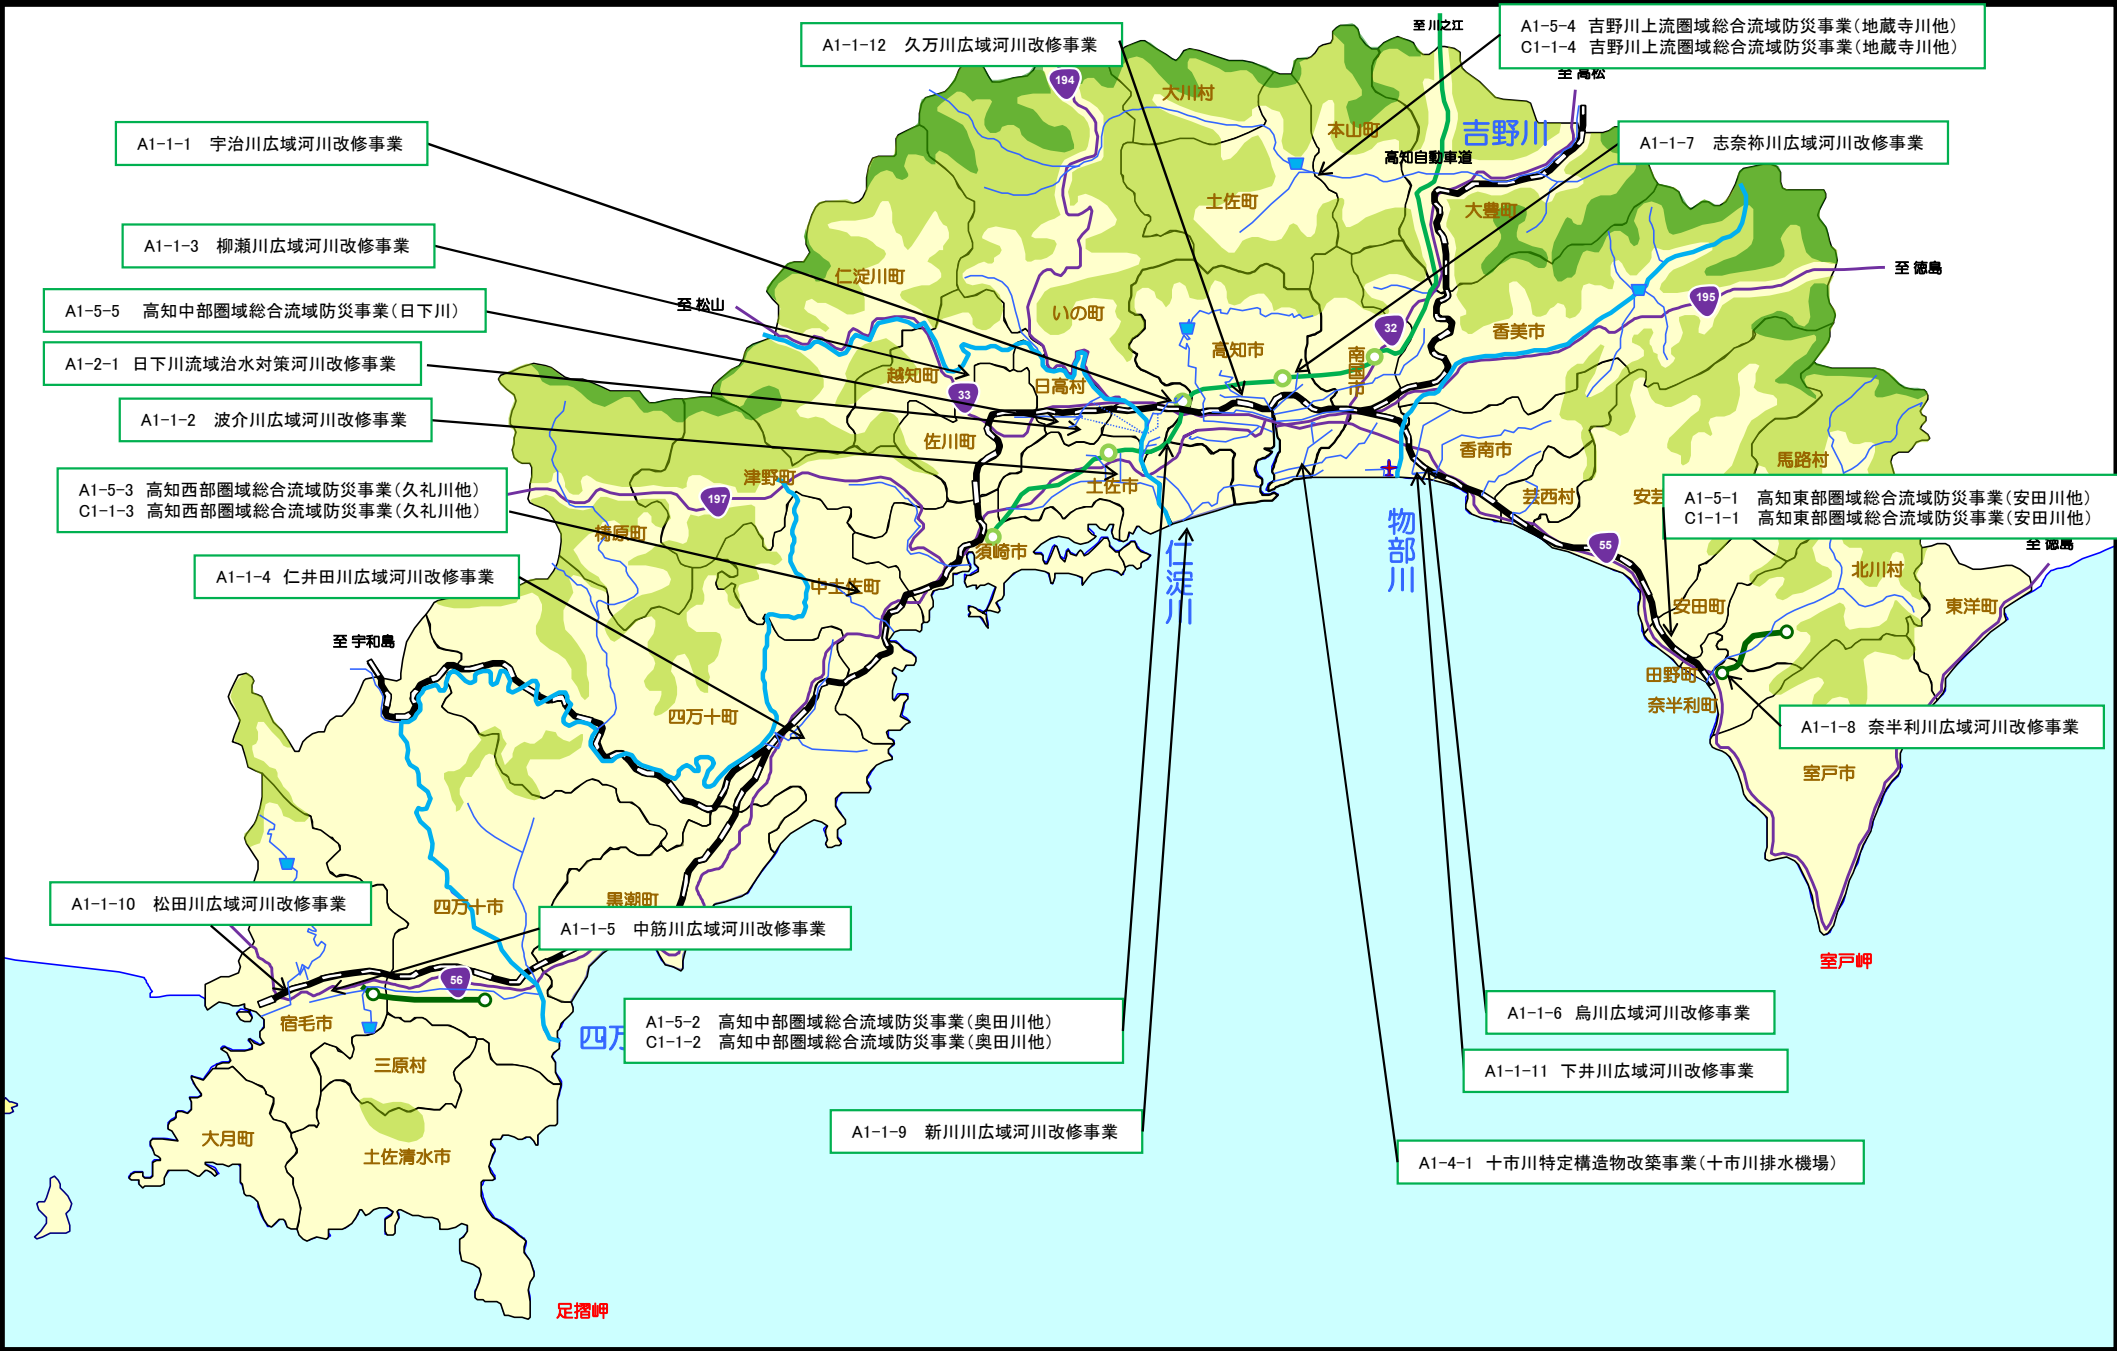

(参考図面)

計画の名称	1 高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)	交付対象	高知県

