

資料１


市町村における実現方策の進捗確認について


各重要施策達成状況


※年度については推進委員会確認年度を記載。（「R8」はR7年度末実績）

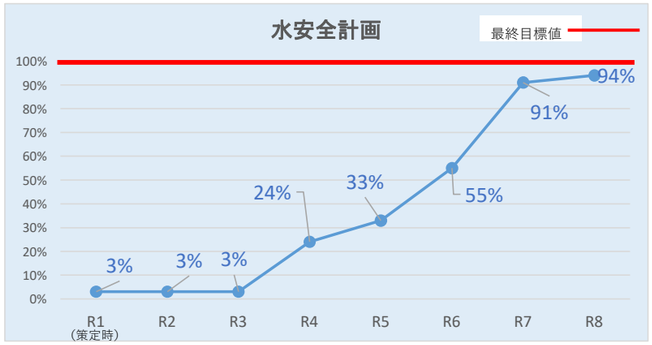


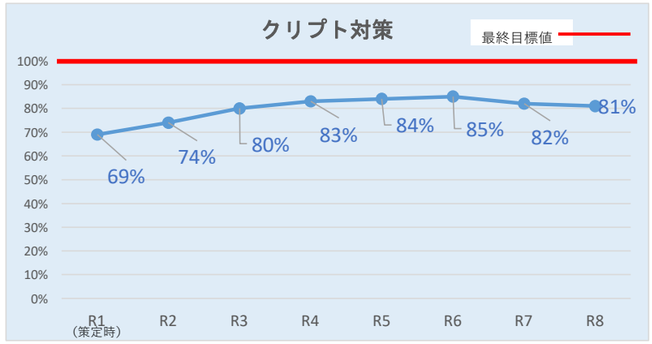


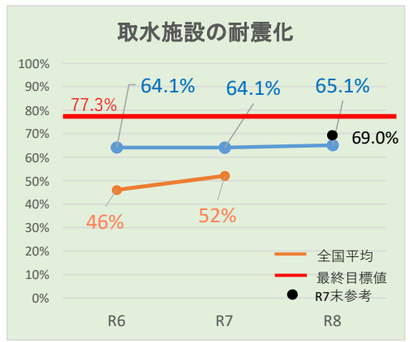


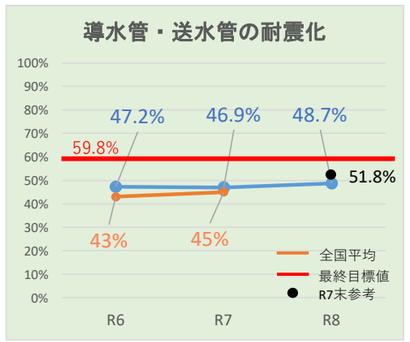


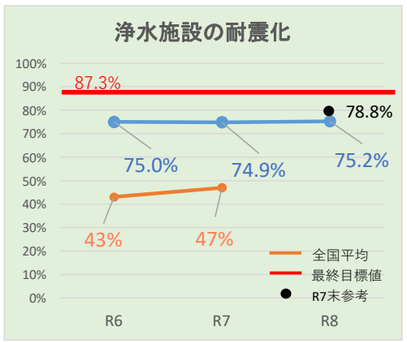


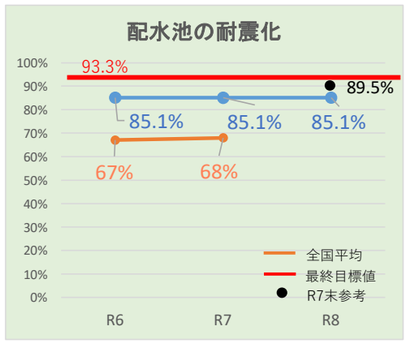

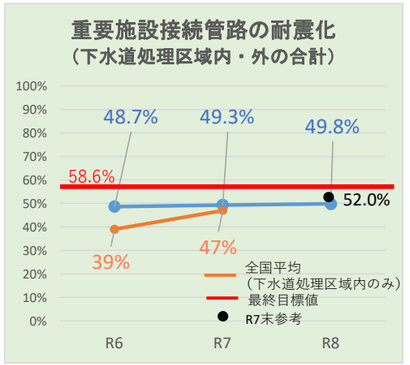

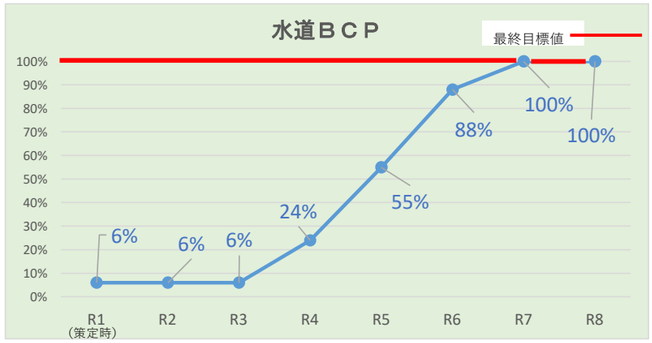

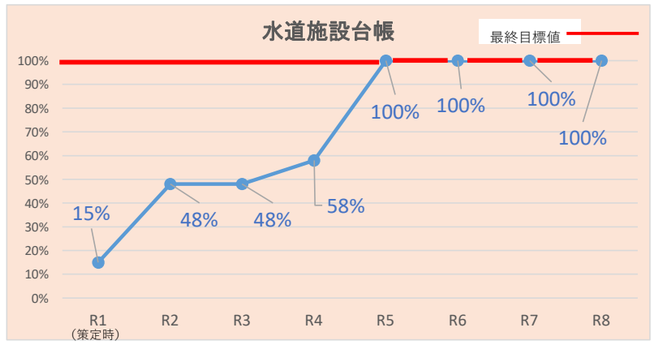

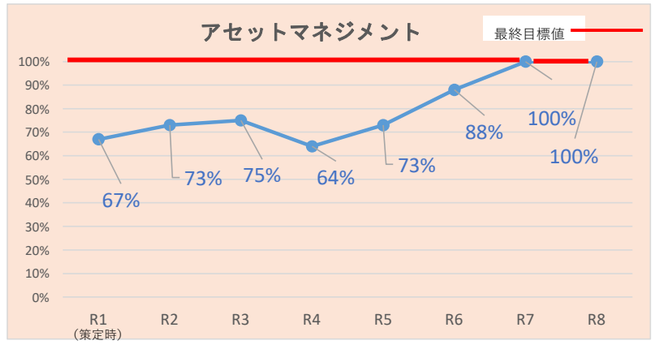

水安全計画　　（最終目標Ｒ11年度末：100%　Ｒ７年度末時点：94%）
- Ｒ７年度末時点で未策定の市町村は、東洋町、津野町
- Ｒ８年度中に全市町村で策定できるよう市町村へ訪問予定

水道施設の耐震化
- 取水施設の耐震化率
  （最終目標Ｒ11年度末：77.3%　Ｒ７年度末目標：69.0%　Ｒ７年度末時点：65.1%）
- 導水管・送水管の耐震適合率
  （最終目標Ｒ11年度末：59.8%　Ｒ７年度末目標：51.8%　Ｒ７年度末時点：48.7%）
- 浄水施設の耐震化率
  （最終目標Ｒ11年度末：87.3%　Ｒ７年度末目標：78.8%　Ｒ７年度末時点：75.2%）
- 配水池の耐震化率
  （最終目標Ｒ11年度末：93.3%　Ｒ７年度末目標：89.5%　Ｒ７年度末時点：85.1%）
- 重要施設接続管路（下水道処理区域内・外の合計）の耐震適合率
  （最終目標Ｒ11年度末：58.6%　Ｒ７年度末目標：52.0%　Ｒ７年度末時点：49.8%）

水道施設台帳　　（中間目標Ｒ６年度末：100%　Ｒ４年度末時点：100%）
- Ｒ４年度末で中間目標100%達成
- 今後は、管路台帳については、全事業者の電子化を目指す

クリプト対策　　（最終目標Ｒ11年度末：100%　Ｒ７年度末時点：81%）
- 上水の対策必要施設１２２施設のうち８６施設が対策済み（70%）
- 簡水の対策必要施設１２４施設のうち１１３施設が対策済み（91%）
- 原水での指標菌検出により、対象施設数が３施設増加した一方、対策実施施設は増えておらず、達成率が下がっている（高知市、四万十町、三原村）
- 取り組みが進まない市町村は、浄水施設導入等の予算の確保がネックとなっている

水道ＢＣＰ　　（最終目標Ｒ11年度末：100%　Ｒ７年度末時点：100%）
- Ｒ６年度末で中間目標100%目標達成
- 今後は、実行性のあるＢＣＰにするため、応急給水計画に重点を置き、応急給水が必要な施設毎の対象人数や給水量、運搬手段、給水源等を一覧で整理できていることを目指す

アセットマネジメント　　（最終目標Ｒ11年度末：100%　Ｒ７年度末時点：100%）
- Ｒ５年度末で中間目標80%目標達成
- Ｒ６年度末で100%達成
- 今後は、交付金の交付要件が厳しくなることを見据え、全事業者でタイプ４Ｄ相当導入を目指す

市町村ごとの各重要施策達成状況　（令和７年度末時点）

黄色セル …Ｒ７達成　　オレンジセル …取組中

		水安全	クリプト（対策実施施設/対策必要施設）		耐震化	BCP	水道台帳	アセット
	高知市	○	×	8 / 9		○	○	○
安芸圏域	室戸市	○	×	2 / 9		○	○	○
	安芸市	○	－	0 / 0		○	○	○
	東洋町	×（R8予定）	－	0 / 0		○	○	○
	奈半利町	○	○	1 / 1		○	○	○
	田野町	○	－	0 / 0		○	○	○
	安田町	○	×	5 / 6		○	○	○
	北川村	○	－	0 / 0		○	○	○
	馬路村	○	×	4 / 5		○	○	○
	芸西村	○	×	1 / 2		○	○	○
中央東圏域	南国市	○	－	0 / 0		○	○	○
	香南市	○	×	0 / 3		○	○	○
	香美市	○	×	23 / 25		○	○	○
	本山町	○	○	4 / 4		○	○	○
	大豊町	○	○	10 / 10		○	○	○
	土佐町	○	○	15 / 15		○	○	○
中央西圏域	土佐市	○	×	1 / 2	別紙参照	○	○	○
	いの町	○	○	12 / 12		○	○	○
	仁淀川町	○	×	7 / 8		○	○	○
	佐川町	○	×	1 / 4		○	○	○
	越知町	○	○	6 / 6		○	○	○
	日高村	○	－	0 / 0		○	○	○
須崎圏域	須崎市	○	×	1 / 8		○	○	○
	中土佐町	○	○	5 / 5		○	○	○
	梼原町	○	○	6 / 6		○	○	○
	津野町	×（R8予定）	○	14 / 14		○	○	○
	四万十町	○	×	30 / 32		○	○	○
幡多圏域	宿毛市	○	○	3 / 3		○	○	○
	土佐清水市	○	×	7 / 13		○	○	○
	四万十市	○	×	14 / 17		○	○	○
	大月町	○	×	10 / 15		○	○	○
	三原村	○	×	0 / 1		○	○	○
	黒潮町	○	×	9 / 11		○	○	○
済の市町村数		31	10	－	ー	33	33	33
進捗率		94%	81%	199 / 246	ー	100%	100%	100%
最終目標値		100%	100%	－	ー	100%	100%	100%

※クリプト進捗率＝対策実施施設/対策必要施設×100

市町村ごとの上下水道耐震化計画における水道施設の耐震化率（令和７年度末時点）

オレンジセル　R7年度末参考値達成

		取水施設	導水管・送水管	浄水施設	配水池	重要施設接続管路（下水道処理区域内・外の合計）
	高知市	99.8%	49.5%	99.9%	95.0%	50.8%
安芸圏域	室戸市	64.2%	25.8%	64.2%	8.1%	33.2%
	安芸市	44.1%	49.8%	100.0%	16.2%	55.4%
	東洋町	0.0%	87.2%	―	100.0%	85.0%
	奈半利町	0.0%	40.1%	100.0%	61.3%	51.7%
	田野町	0.0%	93.1%	―	90.6%	94.1%
	安田町	0.0%	98.6%	0.0%	95.8%	59.9%
	北川村	100.0%	95.3%	―	100.0%	24.6%
	馬路村	25.7%	7.1%	45.7%	15.3%	96.2%
	芸西村	74.5%	71.7%	100.0%	67.2%	28.7%
中央東圏域	南国市	23.6%	49.6%	23.6%	98.3%	46.9%
	香南市	44.0%	29.4%	―	84.3%	35.6%
	香美市	100.0%	44.5%	100.0%	100.0%	24.2%
	（簡水）	100.0%	14.5%	77.7%	44.4%	56.3%
	本山町	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	大豊町	0.0%	45.1%	94.0%	92.1%	83.6%
	土佐町	100.0%	45.5%	100.0%	100.0%	17.9%
中央西圏域	土佐市	78.2%	72.6%	78.2%	82.4%	49.7%
	いの町	100.0%	27.7%	64.7%	88.3%	26.7%
	仁淀川町	39.1%	60.8%	18.5%	39.1%	87.2%
	佐川町	97.0%	97.1%	97.0%	97.2%	71.1%
	越知町	2.3%	18.7%	6.9%	3.1%	67.1%
	日高村	28.7%	100.0%	―	100.0%	48.7%
須崎圏域	須崎市	80.3%	83.5%	19.7%	100.0%	30.8%
	中土佐町	0.0%	63.1%	30.6%	85.6%	66.2%
	梼原町	32.8%	43.1%	37.4%	52.8%	33.3%
	津野町	57.0%	95.5%	100.0%	100.0%	95.7%
	四万十町	26.0%	87.4%	42.8%	44.7%	75.2%
幡多圏域	宿毛市	0.0%	61.1%	0.0%	92.3%	22.5%
	（簡水）	0.0%	100.0%	100.0%	76.5%	―
	土佐清水市	67.0%	52.8%	71.5%	63.2%	49.8%
	四万十市	56.9%	42.7%	58.0%	96.1%	46.1%
	大月町	0.0%	69.3%	0.0%	45.6%	40.2%
	三原村	100.0%	100.0%	―	100.0%	93.3%
	黒潮町	16.5%	1.4%	72.9%	64.5%	0.0%
県全体の耐震化率		65.1%	48.7%	75.2%	85.1%	49.8%
R7年度末参考値		69.0%	51.8%	78.8%	89.5%	52.0%
最終目標値		77.3%	59.8%	87.3%	93.3%	58.6%
