

第3回 高知県新食肉センターワーキンググループ 次 第

日時 平成30年9月19日（水）13:30～
場所 全国農業協同組合連合会高知県本部 3階応接室

1 議 事

- (1) 新食肉センター整備の進め方等について
- (2) 今後のスケジュールについて

【配付資料】

- 資料1 新食肉センター整備の進め方等について
- 資料2 新食肉センター整備に向けた直近のスケジュールについて（詳細版）
- 資料3 新食肉センター整備に向けた全体スケジュールについて（概要版）


別表

高知県新食肉センターワーキンググループ 名簿


所属	職名	氏名	昨年度	ワーキンググループ	作業部会
全国農業協同組合連合会高知県本部	本部長	濱口 達也		○	
全国農業協同組合連合会高知県本部農畜産部	部長	松岡 広	今城 朗		○
全国農業協同組合連合会高知県本部農畜産部	畜産課長	臼木 秀明			○
全国農業協同組合連合会高知県本部農畜産部	畜産課	文野 征志郎			○
高知県農業協同組合中央会		-	徳弘 吉哉	-	-
高知県農業協同組合中央会	自己改革推進室次長	岩本 和孝	山之内 智史	○	○
(一社)高知県畜産会	専務理事	澤田 章史		○	○
土佐れいほく農業協同組合	組合長	西村 行雄		○	
高知県中央食肉事業協同組合	理事長	三谷 勝義		○	○
高知県農業振興部	部長	笹岡 貴文		○	
高知県農業振興部	副部長	西岡 幸生			○
高知県農業振興部	畜産振興課長	谷本 忠司			○
高知県農業振興部	畜産振興課企画監	中山 明			○
高知県農業振興部	畜産振興課長補佐	影山 孝之			事務局
高知県農業振興部	畜産振興課チーフ	渡邊 健	與名 理昇		事務局
高知県農業振興部	畜産振興課主事	古賀 直樹			事務局

1 新食肉センター整備の進め方について（案）

- 新食肉センターの整備は、現センターの老朽化やと畜頭数の減少に伴う運営赤字の課題があるため、可能な限り早期に着手する必要がある。
- 6月20日に開催された第2回ワーキンググループでは、協議会の設立や地質調査及び運営シミュレーションの詳細検討の実施について了承が得られたところ。
- 7月18日に設立した「新食肉センター整備推進協議会」では、新会社の運営シミュレーションや新食肉センターの基本的な仕様について議論を重ね、これらについて関係者間の合意形成がなされたことから、同協議会において、基本設計に着手する。

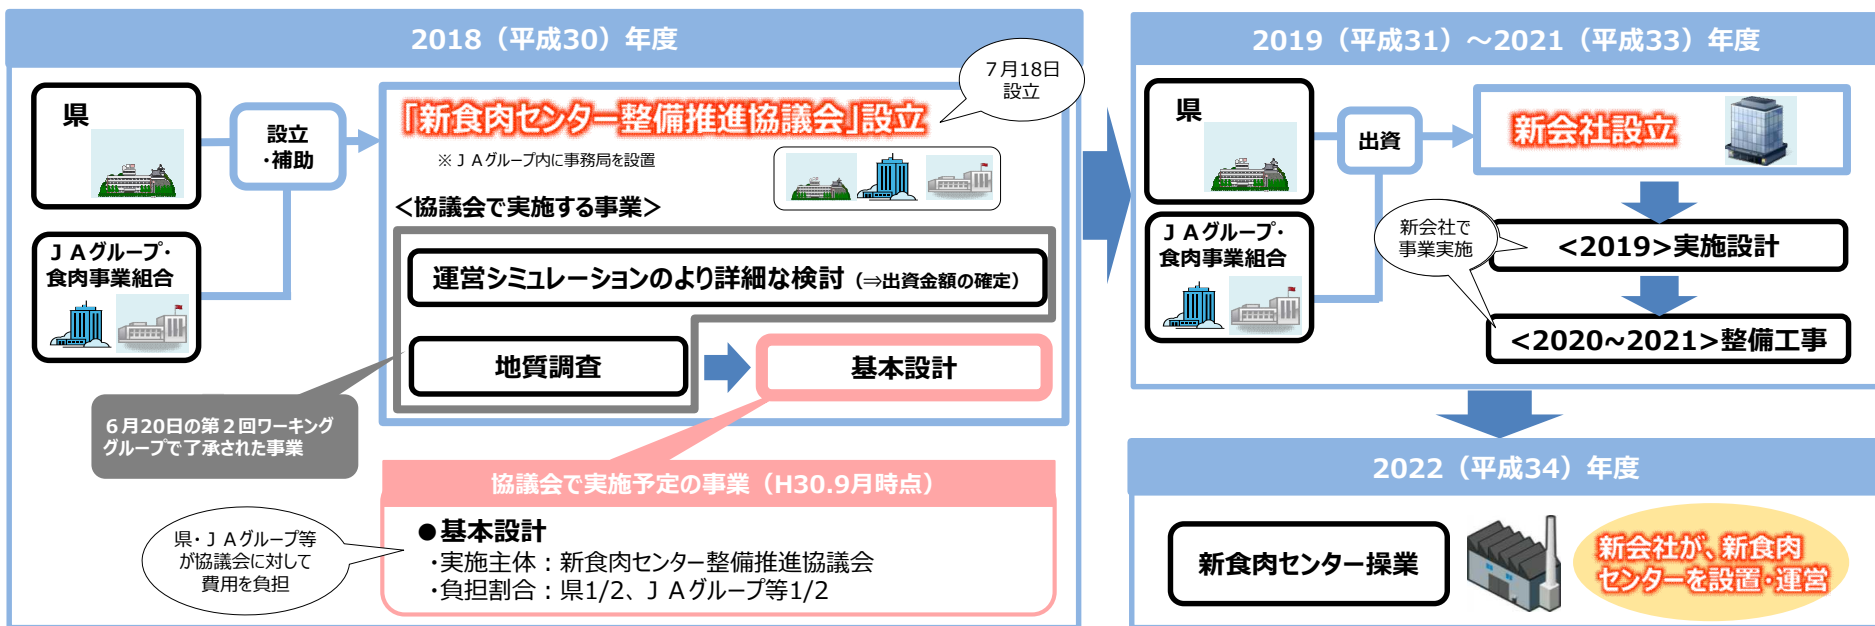

2 新食肉センターの事業イメージと新会社の運営シミュレーションの状況について

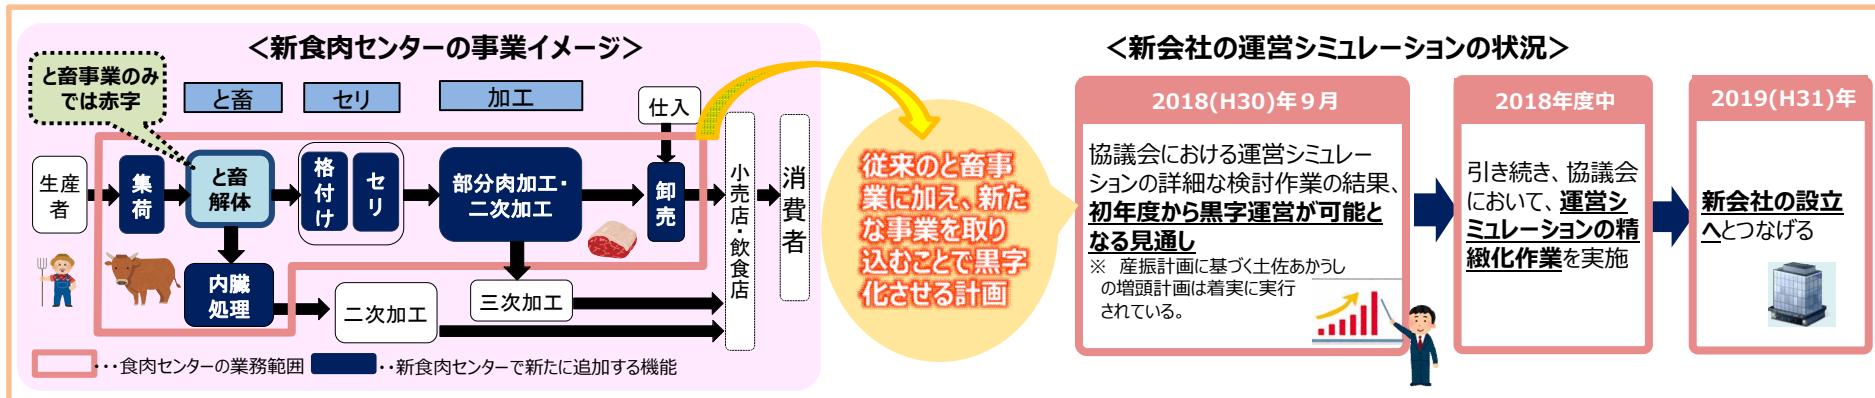

新食肉センター整備に向けた直近のスケジュールについて（詳細版）

資料 2

月 日	関係者スケジュール	協議会等スケジュール
9月 1日 (土)		
2日 (日)		協議会補助金
3日 (月)		基本設計
4日 (火)		地質調査
5日 (水)		
6日 (木)		【地質調査・事務費分】 9/7交付決定・支出負担 行為(県)
7日 (金)		
8日 (土)		
9日 (日)		
10日 (月)		
11日 (火)	自民党役員説明	9/11入札
12日 (水)	県議会各会派説明	仕様書等の検討 施工伺の作成 予定価格の決定
13日 (木)	県議会各会派説明	
14日 (金)	9/14(金)9月補正記者発表(県)	
15日 (土)		
16日 (日)		
17日 (月)		
18日 (火)		
19日 (水)		9/19(水)第3回WG開催
20日 (木)	県9月議会 開会 (23日間)	
21日 (金)		
22日 (土)		
23日 (日)		
24日 (月)		
25日 (火)		
26日 (水)		
27日 (木)		
28日 (金)		
29日 (土)		
30日 (日)	県議会9月定例会 (9/20~10/12)	
10月 1日 (月)		
2日 (火)		
3日 (水)		
4日 (木)		
5日 (金)		
6日 (土)		
7日 (日)		
8日 (月)		【基本設計分】 交付申請(協議会)
9日 (火)		業者の公募 (入札公告)
10日 (水)		
11日 (木)		
12日 (金)	県9月議会 閉会	
13日 (土)		
14日 (日)		
15日 (月)		
16日 (火)		【基本設計分】 交付決定・支出負担行為 (県)
17日 (水)		
18日 (木)		入札(一般競争)
19日 (金)		
20日 (土)		
21日 (日)		
22日 (月)		
23日 (火)		契約の締結 工期6ヶ月 3月末納品
24日 (水)		
25日 (木)		
26日 (金)		
27日 (土)		
28日 (日)		
29日 (月)		
30日 (火)		
31日 (水)		

新食肉センター整備に向けた全体スケジュールについて（概要版）

資料 3

