

建替え手順①


【26年度】

- ・ 実施設計
- ・ 工損調査

実施

旧看護宿舎

解体

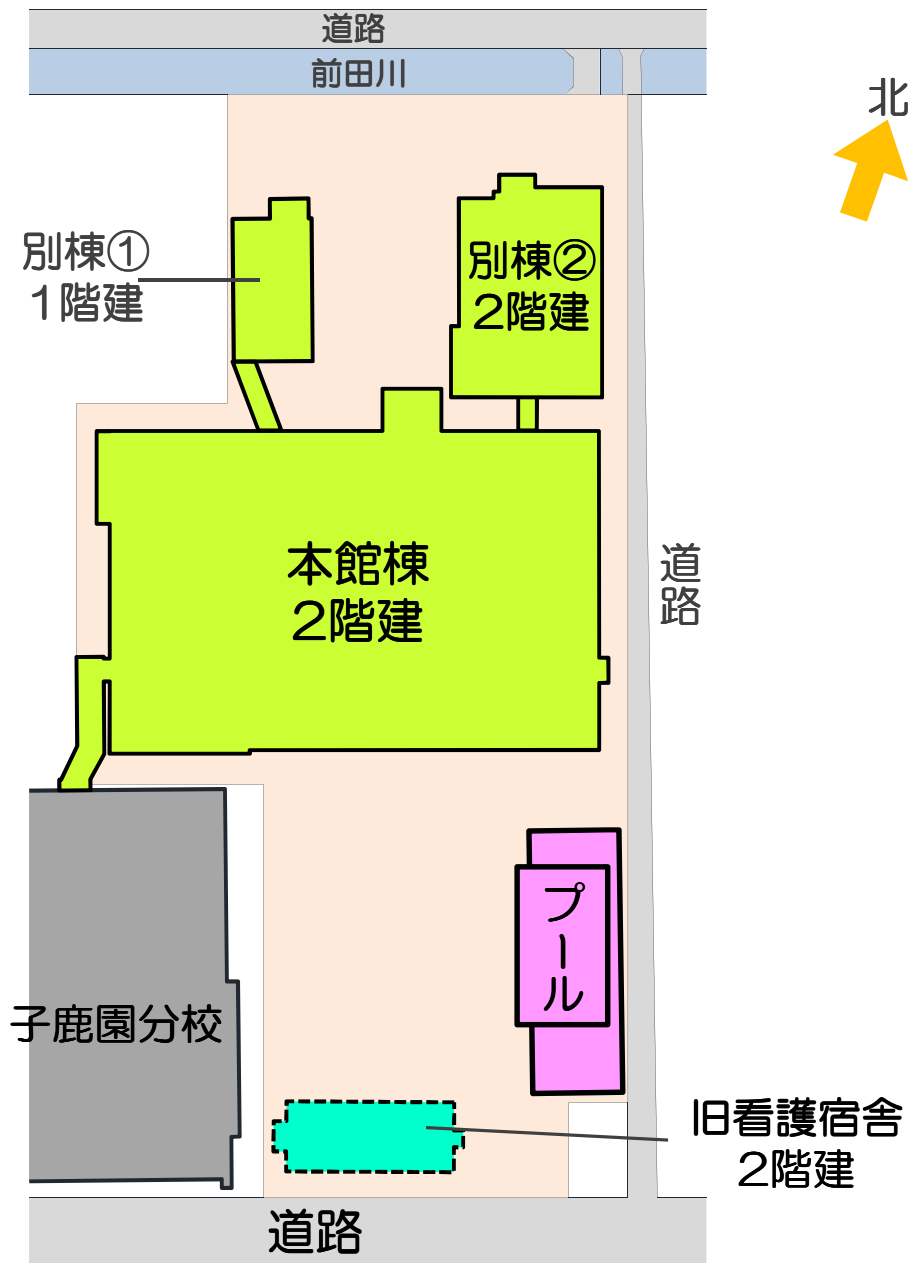

## 建替え手順②

### 【27～28年度】

27年秋


プール 解体

27年秋～28年秋

南棟 建設  
・病棟  
・外来 他

南棟竣工後

移転  
・外来  
・病棟  
・リハビリ（仮）

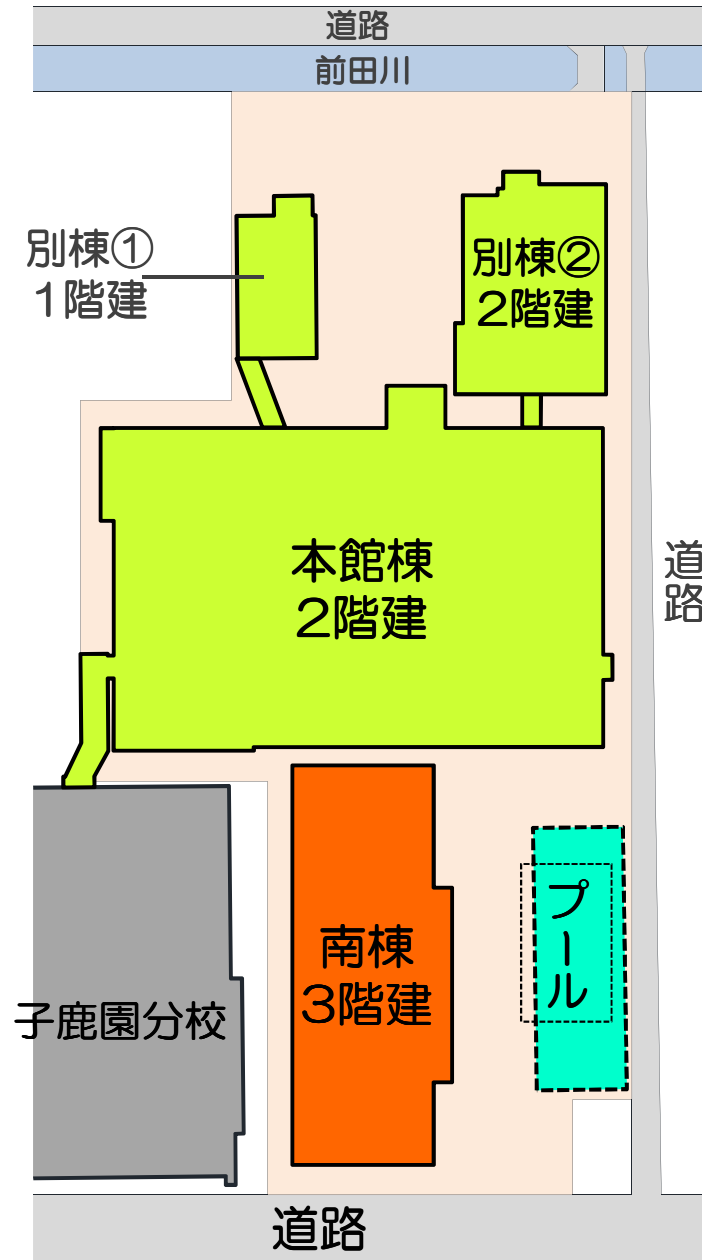


### 建替え手順③

【28年度】

28年秋～29年春

- ・ 本館棟
- ・ 別棟①

解体

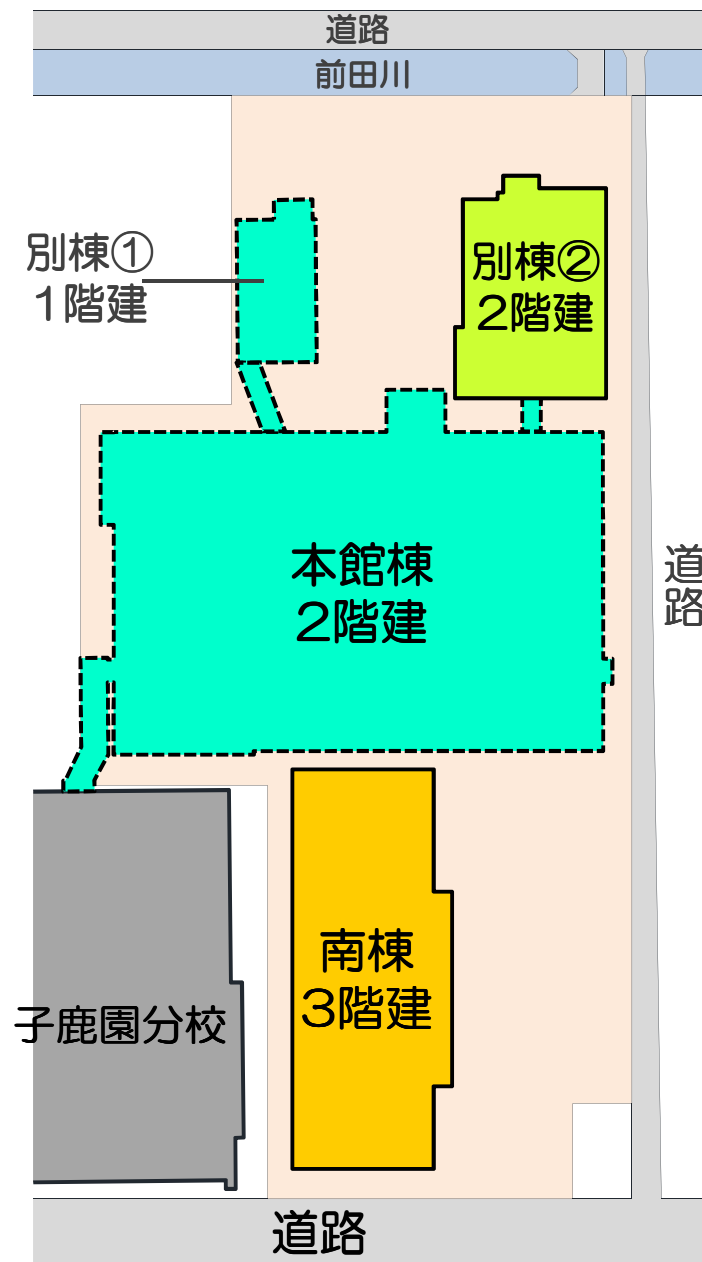

## 建替え手順④

【28～29年度】

29年春～29年冬


北棟

- ・ 児童相談所 建設
- ・ リハビリ
- ・ 通所支援 他

30年春

- ・ リハビリ
- ・ 通所支援

移転

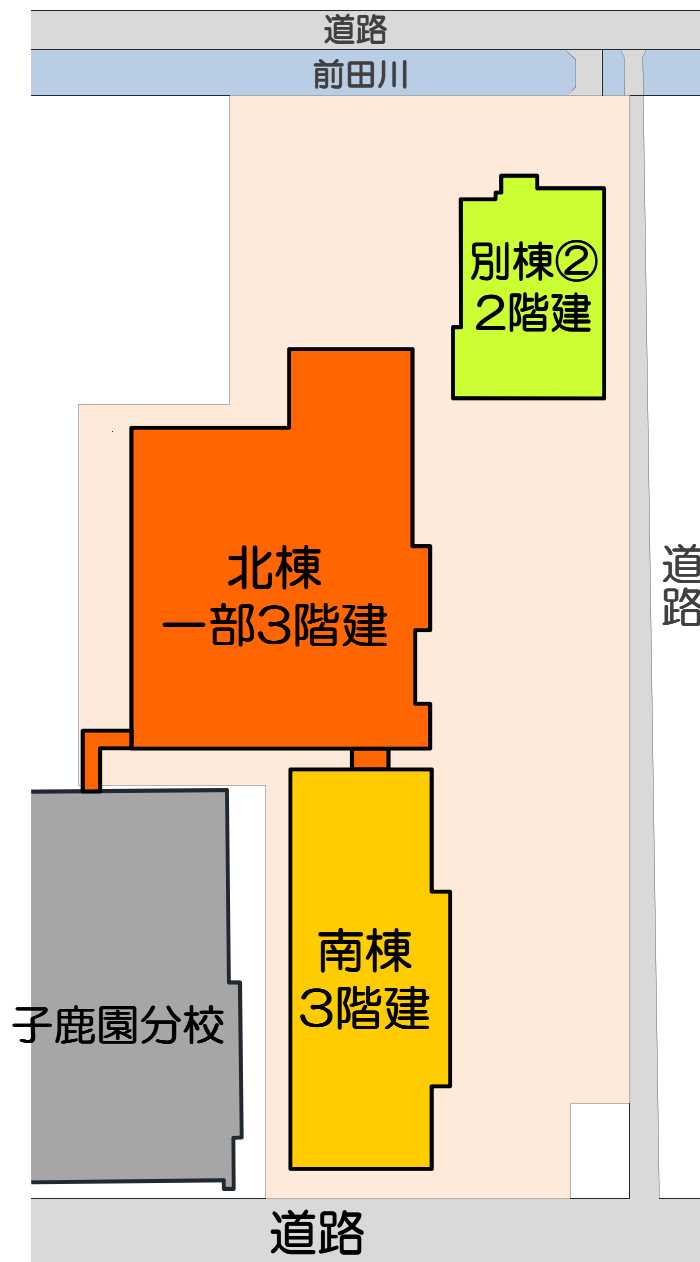

## 建替え手順⑤

【29～30年度】

30年春


- ・別棟② 解体
- ・外構工事実施

30年春～夏

- ・プール 建設

プール竣工後

- ・児童相談所 移転

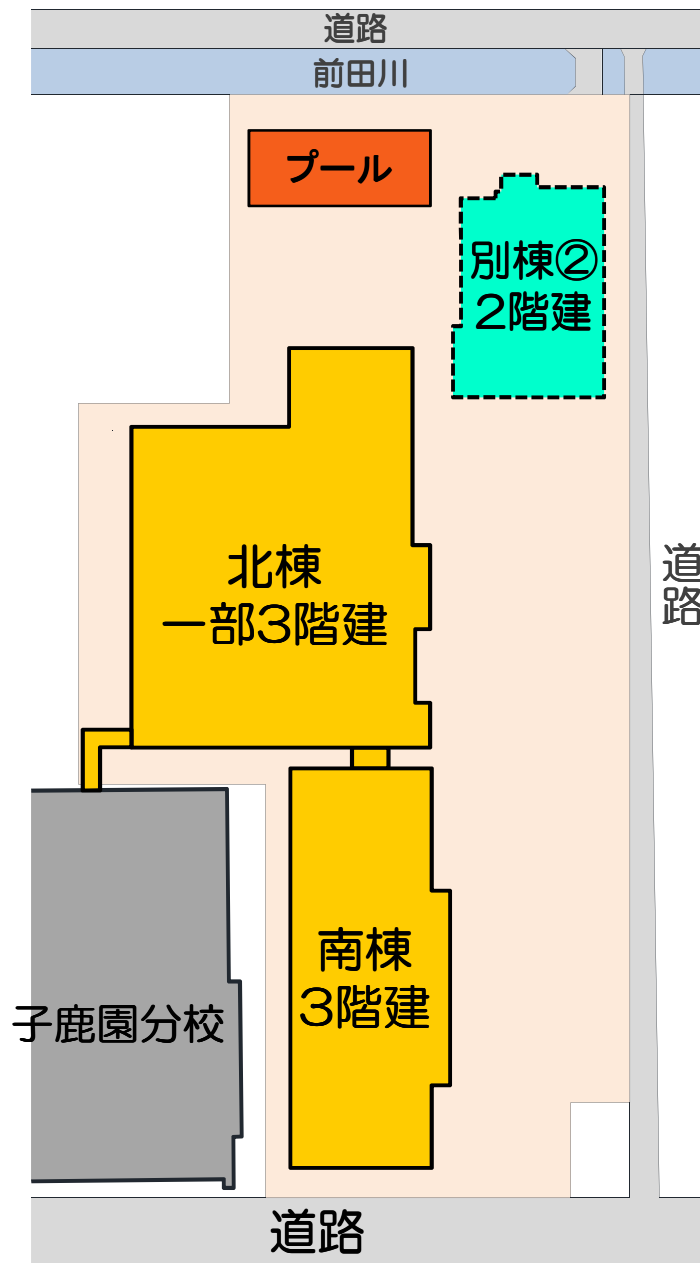

完 成

【30年度】

